



Guía Paso a Paso SUPERVISIÓN DE POSTES

Documento de apoyo interno. No sustituye los procedimientos ni disposiciones oficiales de la empresa.


Elaborado por: Jesús Eduardo Mamani Cervantes.

AGRADECIMIENTO

A César Carrillo y Carlos Ocsa, por su apoyo y disposición constante durante la elaboración de esta guía. Su experiencia y buena voluntad para explicar cada procedimiento hicieron posible documentar este trabajo con el detalle que merece.

Diagrama de flujo de la jornada

Vista general del día. Cada bloque remite a la Parte correspondiente de esta guía.

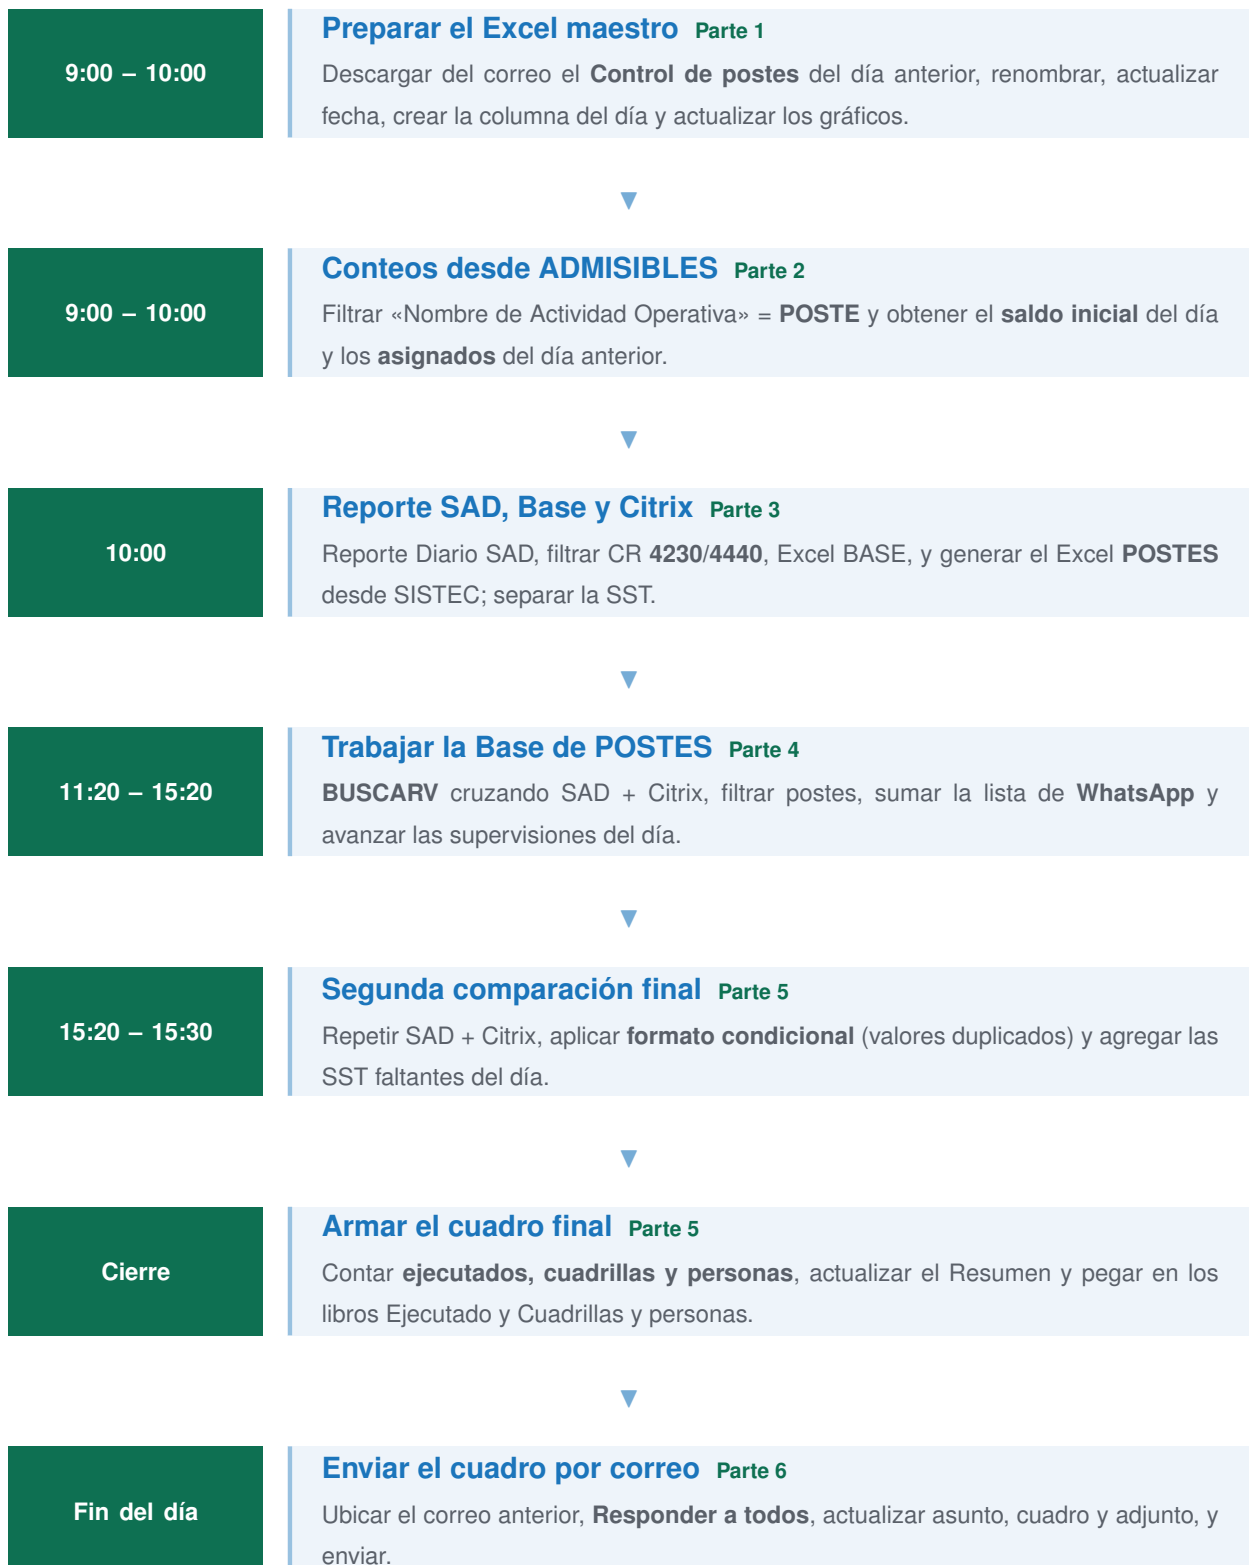

INDICE

Parte 1	Preparar el Excel maestro	5
Parte 2	Conteos desde ADMISIBLES	11
Parte 3	Reporte SAD, Base y Citrix / SISTEC SPO	15
Parte 4	Trabajo del día y comparación final	36
Parte 5	Armar el cuadro final	43
Parte 6	Envío del cuadro por correo	52



01

PARTE

Preparar el Excel maestro



9:00 am – 10:00 am

PARTE 1

Preparar el Excel maestro

● 9:00 am – 10:00 am


Se toma el Excel maestro del día anterior (el mismo que se envió por correo al cierre de la jornada previa) y se deja listo para registrar el avance de hoy.

1 Pedir los postes del día por WhatsApp

Al iniciar el día, se escribe por WhatsApp a **Rosmell Tecsur BT** pidiendo la programación de postes del día.

Rosmell responde con la programación por cuadrilla, indicando contratista (ej. ENCOSSA), capataz, distrito y el código SST + código de poste (ej. «3999168 – 351017108 – RT200»).

Esta lista servirá más adelante para cruzar contra los SST filtrados en el Excel y para completar la Base de POSTES diario.

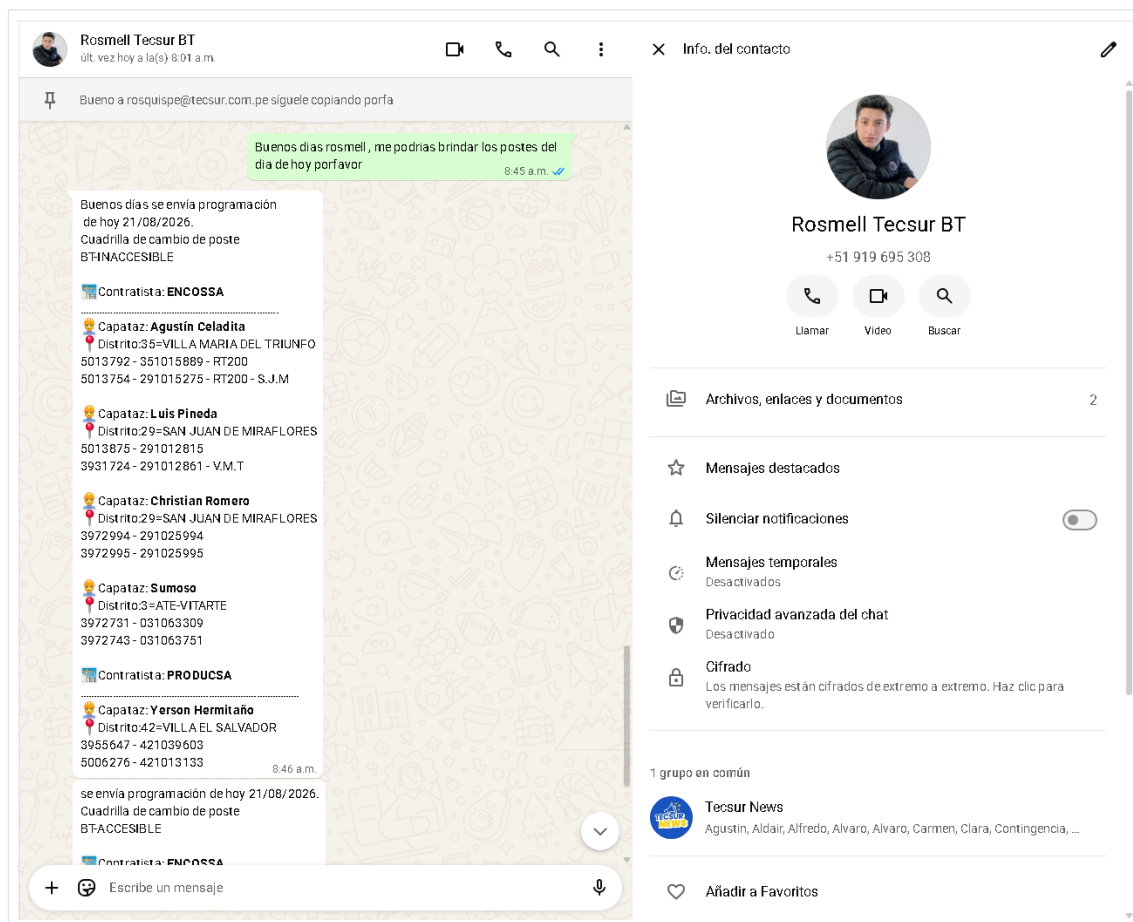


► Solicitud de programación de postes por WhatsApp a Rosmell (Tecsur BT).

2 Descargar el Excel ADMISIBLES desde Outlook

Entrar a Outlook, bandeja de entrada, y buscar el correo con asunto que contenga «ADMISIBLES».

Abrir el adjunto **rep_sst_admisibles_control_atraso_[fecha].xlsx** y verificar que tenga las hojas: Data, Resumen, Emergencia, Obras MT, Obras BT y Mantenimiento.

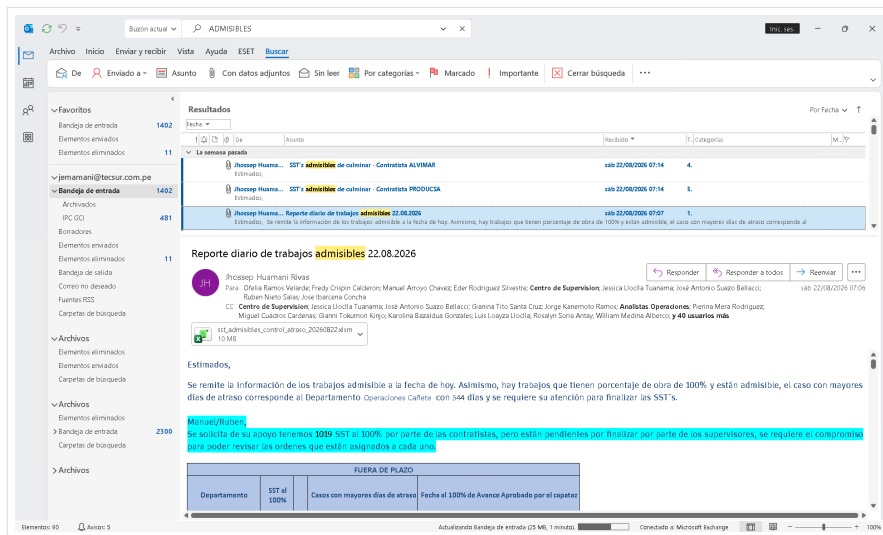


► Bandeja de Outlook: búsqueda y apertura del Excel ADMISIBLES del día.

3 Descargar el Excel maestro desde Outlook

El Excel de control de postes se guarda/renombra en la carpeta local **POSTES** con nomenclatura «**Control de postes DD.MM.26**», continuando la serie de días anteriores.

Cada día se crea un archivo nuevo con su fecha, sin sobrescribir los anteriores; quedan como historial de control diario.

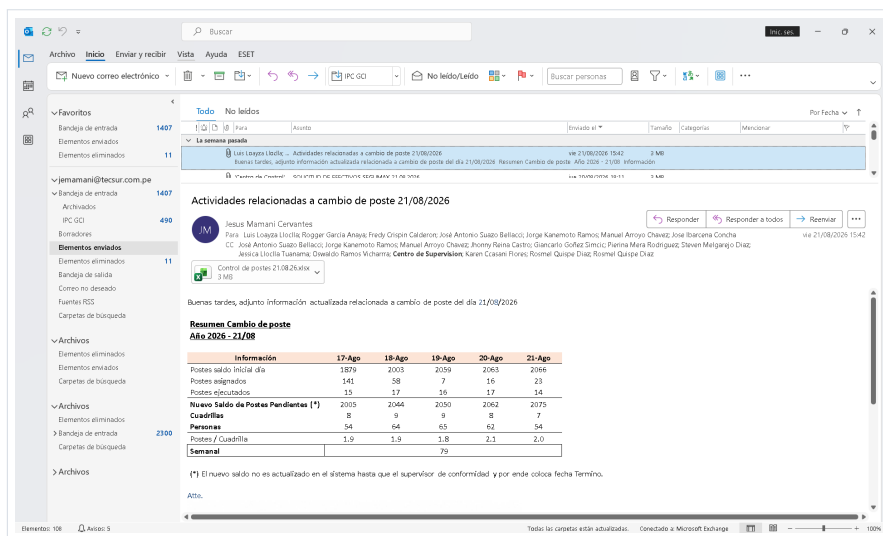

► Carpeta POSTES con el historial de archivos «Control de postes DD.MM.26».

4 Actualizar la hoja Resumen

En la hoja **Resumen**, copiar la última columna con datos (el día anterior) y pegarla al final, en la siguiente columna libre, para crear la columna de hoy.


Esto conserva la fórmula y estructura (saldo inicial, asignados, ejecutados, nuevo saldo, cuadrillas, personas, postes/cuadrilla); solo se actualizan los valores del día.

Seleccionar la primera columna de la tabla (la más antigua) y ocultarla (clic derecho → Ocultar), de modo que la tabla conserve el histórico pero muestre solo los últimos días.

En la columna del día de hoy, borrar los valores a actualizar: Postes saldo inicial día, Postes asignados, Nuevo Saldo de Postes Pendientes (queda en 0), Cuadrillas, Personas y Postes ejecutados; estos quedan resaltados en amarillo en la foto para que sepas a cuales se hace referencia.

Al quedar vacías «Cuadrillas» y «Personas», la fórmula de «Postes/Cuadrilla» marca **#DIV/0!** de forma temporal, hasta completar los datos del día.

En la fila Semanal, combinar las celdas de los días de la semana en curso y extender la fórmula de suma (ej. =SUMA(AMD8+AME8+AMF8+AMG8+AMH8+AMI8)) para incluir la columna del día recién agregado. Esto acumula los postes ejecutados de toda la semana en una sola celda combinada.

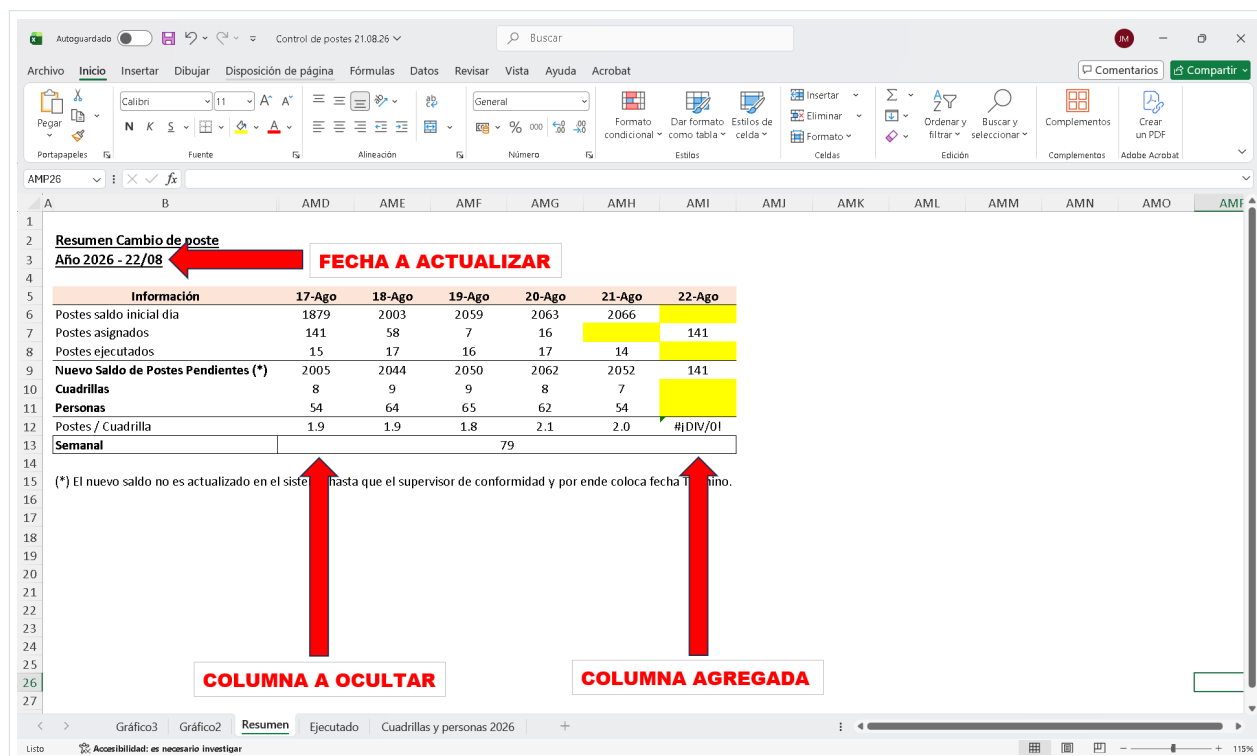

Información	17-Ago	18-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago
Postes saldo inicial día	1879	2003	2059	2063	2066	
Postes asignados	141	58	7	16		141
Postes ejecutados	15	17	16	17	14	
Nuevo Saldo de Postes Pendientes (*)	2005	2044	2050	2062	2052	141
Cuadrillas	8	9	9	8	7	
Personas	54	64	65	62	54	
Postes / Cuadrilla	1.9	1.9	1.8	2.1	2.0	#DIV/0!
Semanal	79					


► Hoja Resumen: se copia la última columna para crear la del día.

5 Actualizar el Gráfico 3

Ir a la hoja **Gráfico3**, clic derecho sobre el gráfico → Seleccionar datos, y extender la referencia del rango (ej. `=Resumen!$B$5:$AMI$5;Resumen!$B$10:$AMI$11`) hasta la columna del día agregada.

Verificar que la fecha de hoy aparezca en las etiquetas del eje horizontal y aceptar, nos debe quedar como en la foto referencial.

Tras extender el rango, el gráfico muestra ya la barra del día de hoy (en 0, hasta cargar los datos reales de cuadrillas y personas). La línea de tendencia se ajusta automáticamente al nuevo punto.

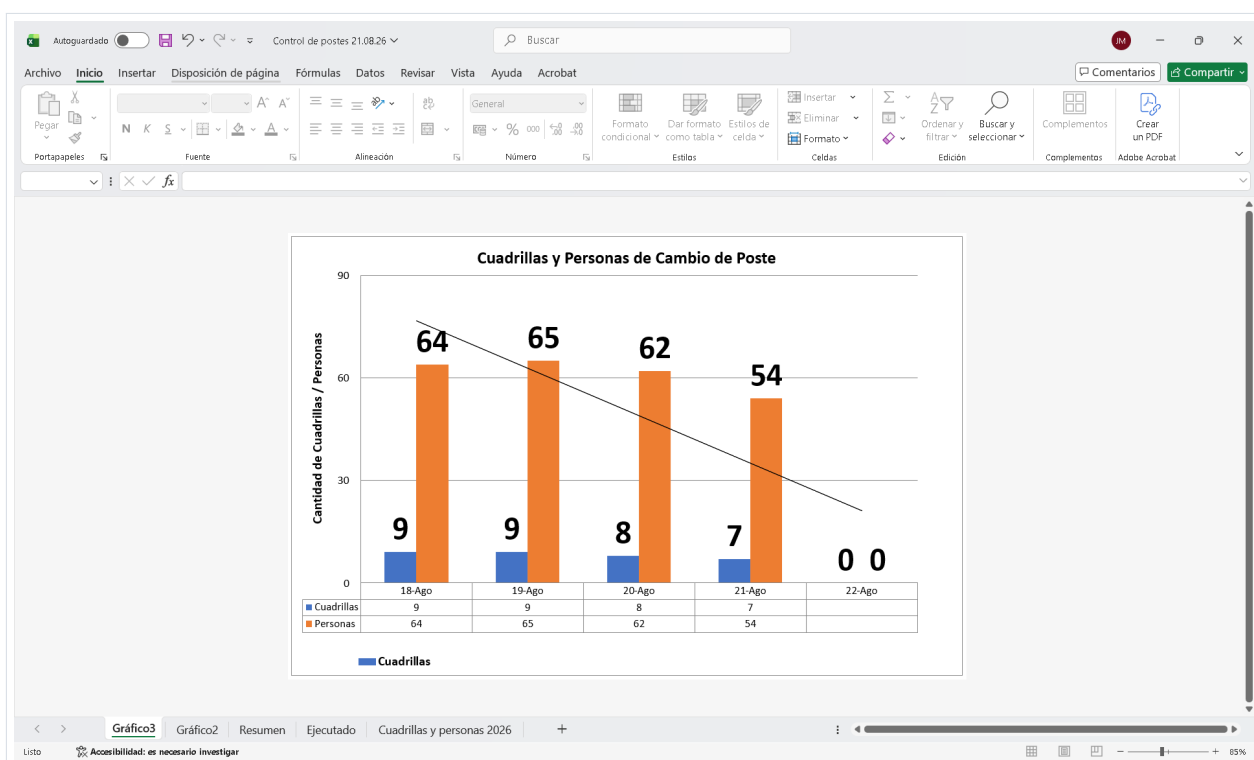


► Gráfico3 «Cuadrillas y Personas de Cambio de Poste» antes de extender el rango.

6 Actualizar el Gráfico 2

Repetir el mismo procedimiento en la hoja **Gráfico2** («Evolución Macro-actividad Postes»): clic derecho → Seleccionar datos → extender el rango (ej. `=Resumen!$B$5:$B$8;Resumen!$BC$5:$ALH$8`) hasta la columna de hoy.

Las series (saldo inicial, asignados, ejecutados) y el eje horizontal se actualizan automáticamente.

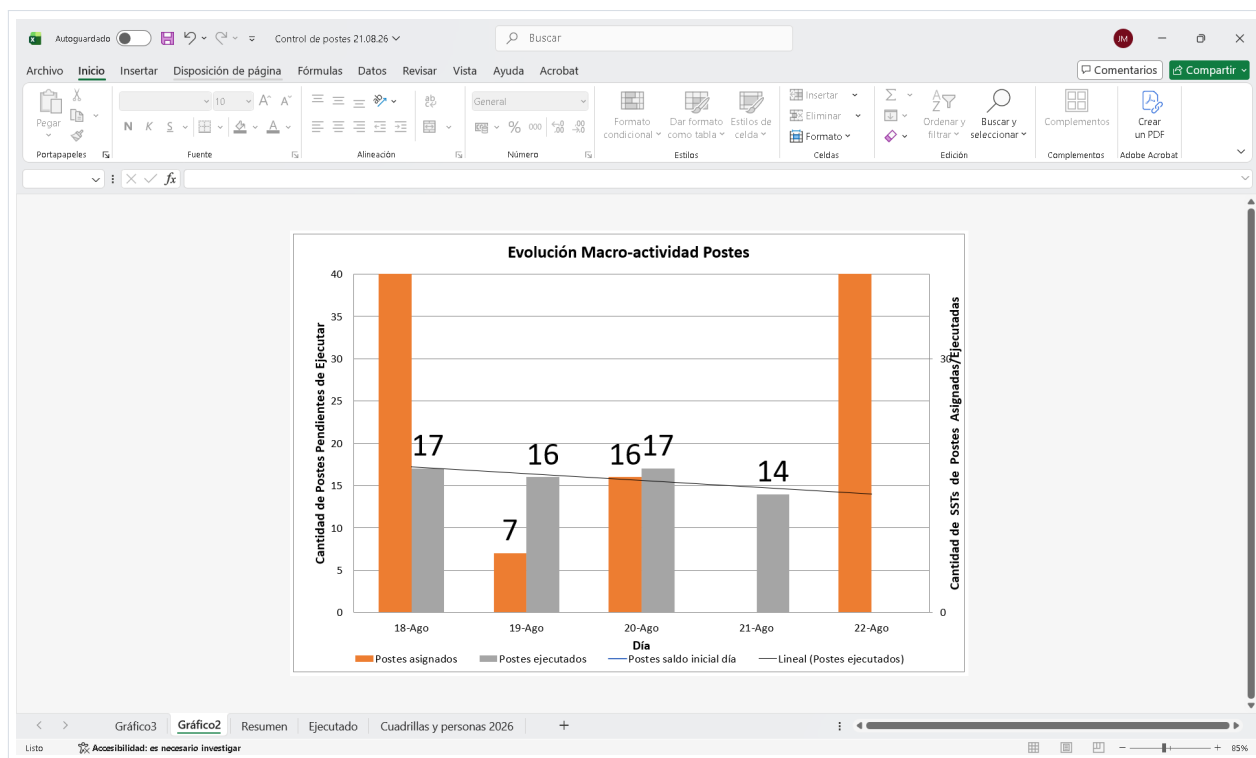

► Extensión del rango de datos del Gráfico2 en la hoja Resumen.

✓ LISTO

Excel maestro actualizado al 80%, respecto al inicial del día, ahora nos toca complementarlo con "CONTEOS DESDE ADMISIBLES" para tenerlo al 90 % antes de empezar nuestras actividades. Con estos pasos, el Excel maestro queda parcialmente listo: Resumen con la columna del día agregada, columna antigua oculta, Gráfico2 y Gráfico3 con el rango extendido y la celda Semanal recalculada. A partir de aquí se pasa a trabajar el Excel ADMISIBLES antes mencionado, para obtener los conteos del día.



02

PARTE

Conteos desde ADMISIBLES



9:00 am – 10:00 am

PARTE 2

Conteos desde ADMISIBLES

● 9:00 am – 10:00 am


De este archivo salen dos de los números clave del cuadro Resumen: el saldo inicial del día y los postes asignados de la fecha de primer envío a TS más reciente.

1 Filtrar «Nombre de Actividad Operativa» = POSTE

En la hoja **Data** del Excel ADMISIBLES, ir a la columna AX «NOMBRE DE ACTIVIDAD OPERATIVA». Abrir el filtro y escribir **POSTE** en el buscador de texto.

Del listado de resultados, dejar marcadas solo las actividades de cambio de poste real: Cambio de poste accesible, Cambio de poste inaccesible con Cabria/Vientos, Cambio de Poste priorid Inacc con Viento, Cambio de Poste prioritario Accesible, Cambio de Poste RT 200 Accesible, Cambio Poste RT200 Inacc. con Cabria/Vientos.

Desmarcar las que no correspondan: Cimentación de Postes, Enderezado de Postes, Profundizado de Postes, Programa de medición/reforzamiento de postes, Reforzamiento de postes de MT en caliente.

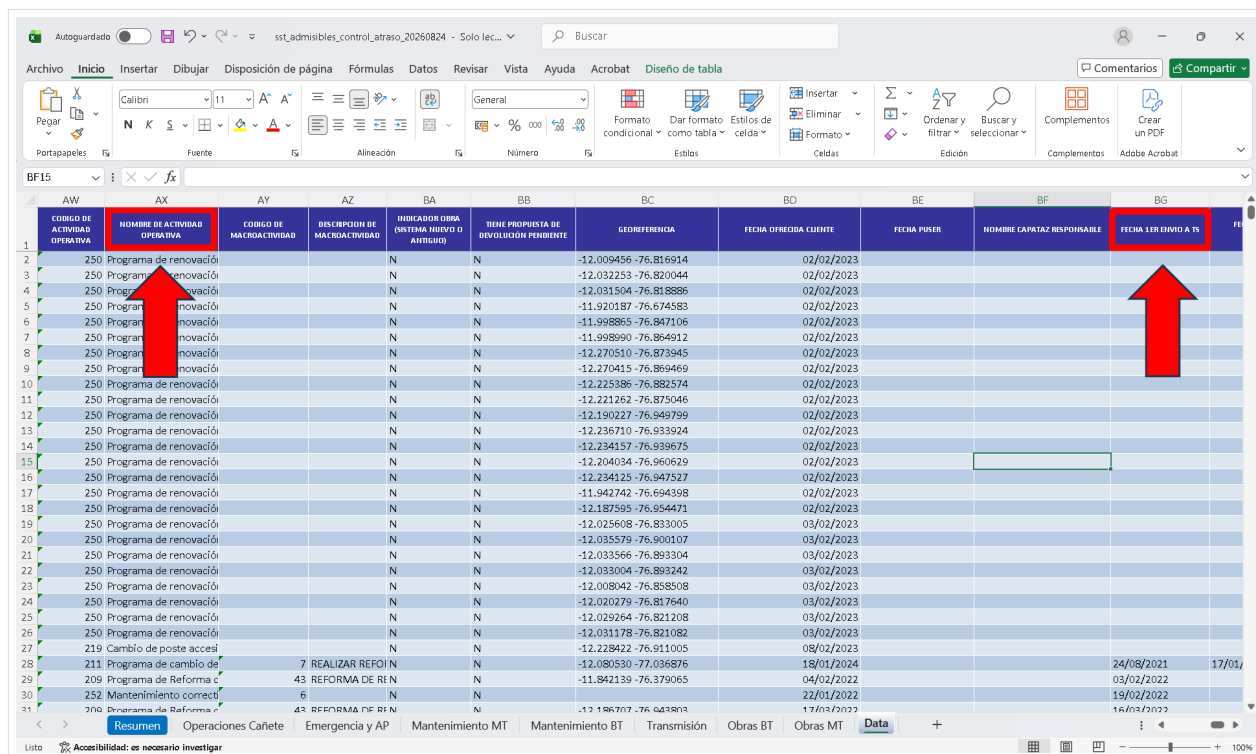

AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA	NOMBRE DE ACTIVIDAD OPERATIVA	CÓDIGO DE MACROACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE MACROACTIVIDAD	INDICADOR OBRA SISTEMA NUEVO O ANTIGUO	TIENE PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN PENDIENTE	GEOGRAFÍA	FECHA OFRECIDA CLIENTE	FECHA PRIMER	NOMBRE CAPATAZ RESPONSABLE	FECHA 1ER ENVÍO A TS	FECHA 2º ENVÍO A TS
1	250 Programa de renovación			N	N	-12.009456 -76.815914	02/02/2023				
2	250 Programa de renovación			N	N	-12.032253 -76.820044	02/02/2023				
3	250 Programa de renovación			N	N	-12.031504 -76.818886	02/02/2023				
4	250 Programa de renovación			N	N	-11.920187 -76.674583	02/02/2023				
5	250 Programa de renovación			N	N	-11.998855 -76.847106	02/02/2023				
6	250 Programa de renovación			N	N	-11.998890 -76.864912	02/02/2023				
7	250 Programa de renovación			N	N	-12.270510 -76.873945	02/02/2023				
8	250 Programa de renovación			N	N	-12.270415 -76.869469	02/02/2023				
9	250 Programa de renovación			N	N	-12.225386 -76.882574	02/02/2023				
10	250 Programa de renovación			N	N	-12.221262 -76.875046	02/02/2023				
11	250 Programa de renovación			N	N	-12.190227 -76.849799	02/02/2023				
12	250 Programa de renovación			N	N	-12.236710 -76.933924	02/02/2023				
13	250 Programa de renovación			N	N	-12.234157 -76.939675	02/02/2023				
14	250 Programa de renovación			N	N	-12.204034 -76.960629	02/02/2023				
15	250 Programa de renovación			N	N	-12.234125 -76.947527	02/02/2023				
16	250 Programa de renovación			N	N	-11.942742 -76.694398	02/02/2023				
17	250 Programa de renovación			N	N	-12.187595 -76.954471	02/02/2023				
18	250 Programa de renovación			N	N	-12.025608 -76.833005	03/02/2023				
19	250 Programa de renovación			N	N	-12.035579 -76.900107	03/02/2023				
20	250 Programa de renovación			N	N	-12.033566 -76.893304	03/02/2023				
21	250 Programa de renovación			N	N	-12.033004 -76.895242	03/02/2023				
22	250 Programa de renovación			N	N	-12.008042 -76.858508	03/02/2023				
23	250 Programa de renovación			N	N	-12.000279 -76.877940	03/02/2023				
24	250 Programa de renovación			N	N	-12.029264 -76.821208	03/02/2023				
25	250 Programa de renovación			N	N	-12.031178 -76.821082	03/02/2023				
26	250 Programa de renovación			N	N	-12.228422 -76.911005	08/02/2023				
27	219 Cambio de poste accesible			N	N	-12.080530 -77.036876	18/01/2024			24/08/2021	17/01/2022
28	211 Programa de cambio de	7	REALIZAR REFOI	N	N	-11.842139 -76.379065	04/02/2022			03/02/2022	
29	209 Programa de Reforma c	43	REFORMA DE RI N	N	N						
30	252 Mantenimiento correcti	6		N	N		22/01/2022			19/02/2022	
31	216 Programa de Reforma	43	REFORMA DE RI N	N	N	-12.196707 -76.043903	17/03/2022			16/03/2022	

► Filtro de texto «POSTE» en la columna Nombre de Actividad Operativa: qué marcar y qué desmarcar.

2 Contar el saldo inicial del día y agregar el filtro "FECHA 1ER ENVIO A TS"

Con únicamente el filtro de Actividad Operativa activo, la barra de estado inferior muestra el conteo total (ej. «Se encontraron 1879 registros»).

Ese número es el **Postes saldo inicial día** de hoy y se traslada al cuadro del Excel maestro.

Ahora aún con el filtro de Actividad Operativa activo, abrir el filtro de la columna BG «FECHA 1ER ENVIO A TS». En el árbol del filtro, dejar marcado únicamente el día de ayer (dentro del año/mes actual ya expandido), y desmarcar el resto de días, años anteriores y «(Vacías)». Con ambos filtros aplicados, solo quedan los SST cuyo primer envío a TS fue exactamente ayer (en el ejemplo, 7 registros, indicador «Recuento: 7»). Ese valor es Postes asignados del día anterior y se traslada también al Excel maestro

► Barra de estado con el conteo total de SST filtradas por poste.


► Filtro de fecha «FECHA 1ER ENVIO A TS»: se deja marcado únicamente el día anterior.

4 Colocar ambos valores en el Excel maestro

En la hoja Resumen del Excel maestro, columna del día: **Postes saldo inicial día = 1879** (Paso 2) y **Postes asignados = 7** (Paso 3).

El Nuevo Saldo de Postes Pendientes se recalcula automáticamente (en este caso permanece en 1800, ya que aún no se descuenta lo ejecutado). Postes ejecutados, Cuadrillas y Personas quedan pendientes de completar en la tarde.

Con esto queda terminado el **acomodo previo** del cuadro del Excel maestro.

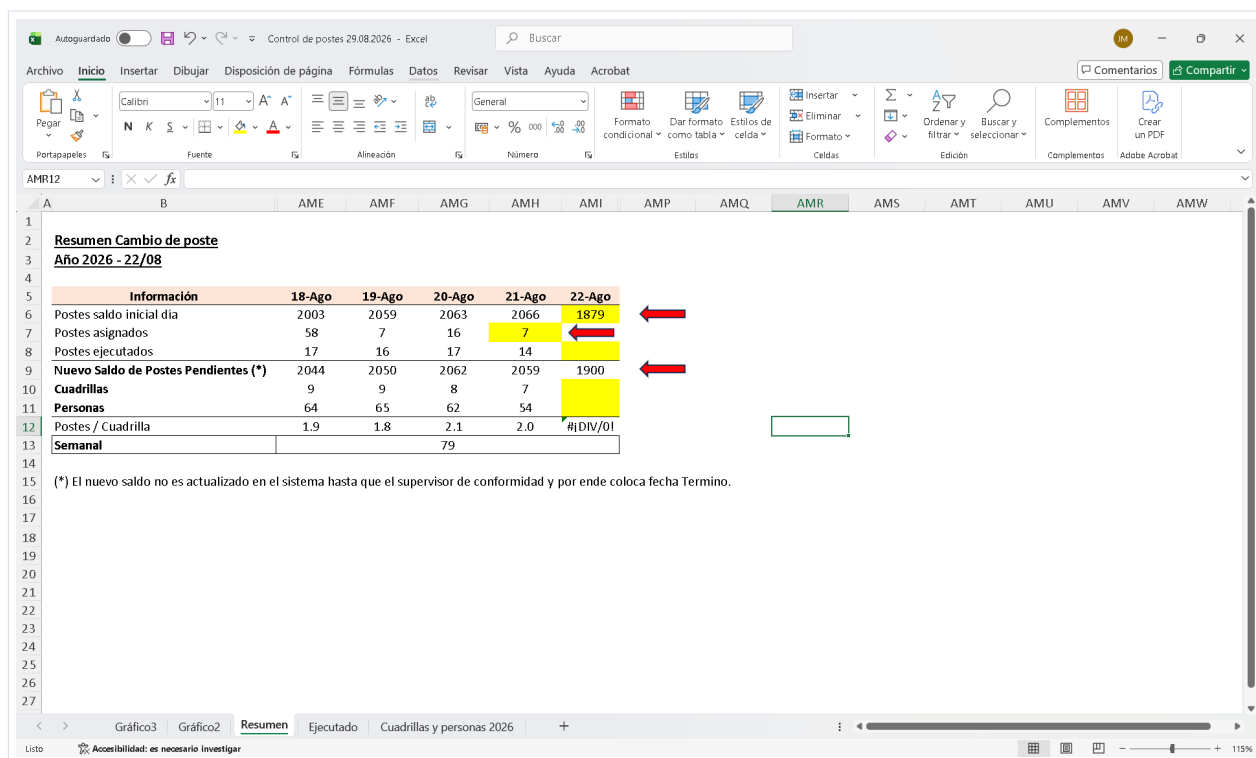

Información	18-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago
Postes saldo inicial día	2003	2059	2063	2066	1879
Postes asignados	58	7	16	7	
Postes ejecutados	17	16	17	14	
Nuevo Saldo de Postes Pendientes (*)	2044	2050	2062	2059	1900
Cuadrillas	9	9	8	7	
Personas	64	65	62	54	
Postes / Cuadrilla	1.9	1.8	2.1	2.0	#DIV/0!
Semanal			79		

(*) El nuevo saldo no es actualizado en el sistema hasta que el supervisor de conformidad y por ende coloca fecha Termino.

► Cuadro Resumen con saldo inicial (1879) y asignados (7) ya colocados.



03

PARTE

Reporte SAD, Base y Citrix / SISTEC SPO



10:00 am – 11:20 am

PARTE 3

Reporte SAD, Base y Citrix / SISTEC SPO


• 10:00 am – 11:20 am

Este bloque genera la base oficial de SST del día: se descarga el Reporte Diario SAD, se filtra por área (CR TECSUR), se carga esa lista al sistema SISTEC dentro del Citrix, y se obtiene de vuelta un Excel con el detalle completo de cada solicitud (POSTES).

15 Ingresar a la Plataforma Web de Tecsur

Entrar a la Plataforma Web de Tecsur (ldsweb.luzdelsur.com.pe) con la cuenta de Tecsur S.A.

Del panel de Aplicaciones, hacer clic en «**Reporte Diario Sad**».

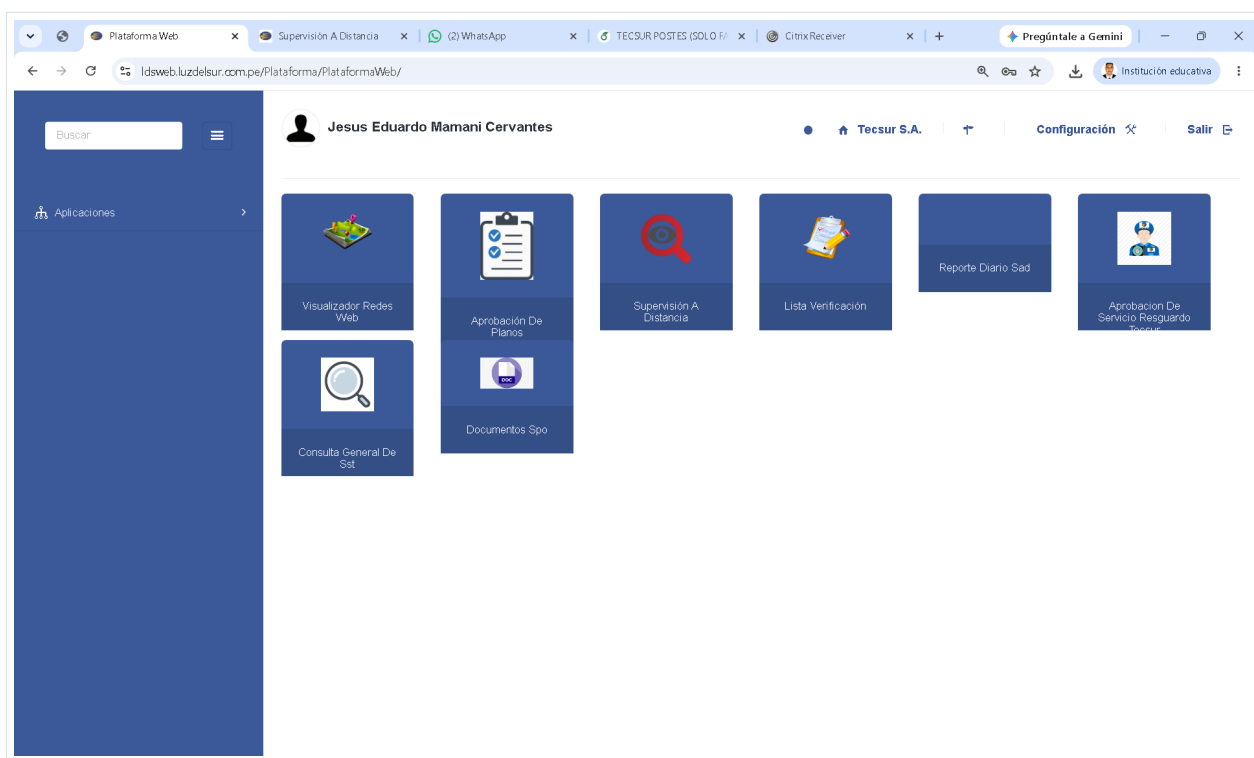

► Panel de aplicaciones de la Plataforma Web Tecsur.

16 Buscar en Informe de Supervisión a Distancia

En el desplegable **Tipo Atención**, seleccionar «**Proyectos y Mant. BT**».

En Fecha, dejar la fecha de hoy. En Tipo Usuario se mantiene «Capataz». Clic en el ícono de la lupa (Buscar).

Reporte de Supervisión a Distancia

SST: Tipo Atención : Fecha : Tipo Usuario :

SST	Contratista	Responsable	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR	CR LDS	Dirección	Distrito

Filtro Tipo Atención = Proyectos y Mant. BT, fecha de hoy.

17 Descargar el reporte

Con los resultados cargados, clic en el botón de **descarga** (al costado de la lupa). Se genera el archivo **REPORTESAD_OBRASBT.xlsx**.

Reporte de Supervisión a Distancia

SST: Tipo Atención : Fecha : Tipo Usuario :

SST	Contratista	Responsable	Cant. Fotos	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR	CR LDS	Dirección	Distrito
5015137	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SANCHEZ	51	LUIS VERA HORNA		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	CHOQUEHUANCA CDA 9 (LA HUACA)	SAN ISIDRO
5001094	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	DARIO SOCA ASTUCURI	37	LARRY YAPU ABARCA		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	MZ C LT 9 GRUPO 16 SECTOR 2 FJ VILLA EL SALVADOR	VILLA EL SALVADOR
5004064	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	WILMER DOMINGUEZ PASCO	8	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	PROLG MISTI 1278 INT C	LA VICTORIA
4000243	ENCOSA S.A.C.	HILARIO LETONA CHOQUEHUANCA	18	DENIS VASCO MALLMA		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	AV BALTICO MZ X LT 2 SECTOR LADERAS E NAPLO	PUCUSANA
5006740	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y AP		VILLA MARIA DEL TRIUNFO
5007372	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DISTRIB. SUR		SAN VICENTE DE CAÑETE
5009719	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	JEANCARLO DE LA CRUZ SANCHEZ	3	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60244=PROYECTOS	MZ F7 LT 02 URB PLAYA LOS LOBOS	CERRO AZUL
5005976	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y AP		VILLA MARIA DEL TRIUNFO

► Listado de resultados y botón de descarga.

Reporte de Supervisión a Distancia

SST: Tipo Atención: **Proyectos y Mant. BT** Fecha: **22/08/2026** Tipo Usuario: **Capataz**

SST	Contratista	Responsable	Cant. Fotos	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR	CR LDS	Direccion	Distrito
5015137	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SANCHEZ	51	LUIS VERA HORNA		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	CHOQUEHUANCA CDA 9 (LA HUACA)	SAN ISIDRO

► Archivo descargado: **REPORTE_SAD_OBRASBT (14).xlsx.**

18 Activar filtros en el reporte descargado

Abrir el archivo, ubicarse en la celda A1 («REPORTE DE ATENCIONES») y presionar **Ctrl + Shift + L** para activar el filtro automático en toda la fila de encabezados.

Autoguardado ☐ REPORTE_SAD_OBRASBT

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibri 11 A+ Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Crear un PDF

	Responsable	Cant. Fotos	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR	CR LDS	Direccion	Dist
2	CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SANCHEZ	51	LUIS VERA HORNA		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	CHOQUEHUANCA CDA 9 (LA HUACA)	SAN ISIDRO
3	DARIO SOGA ASTUCURI	37	LARRY YAPU ABARCA		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	MZ C LT 9 GRUPO 16 SECTOR 2 PI VILLALBA	SAN ISIDRO
4	WILMER DOMINGUEZ PASCO	8	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	PROLG MISTI 1278 INT C	LA HUACA
5	HILARIO LETONA CHOQUEHUANCA	18	DENIS VASCO MALLMA		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	AV BALTICO MZ X LT 2 SECTOR LADERA	PUCALLPA
6	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
7	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DISTRIBUCION		SAN ISIDRO
8	JEANCARLO DE LA CRUZ SANCHEZ	3	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60244=PROYECTOS	MZ F7 LT 02 URB PLAYA LOS LOBOS	CERRO
9	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
10	CHRISTIAN MEYER PINEDO TUOTO	37	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	JR. HUMBOLDT CDRA 4(AV. MANCO CAJAMARCA)	LA HUACA
11	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
12	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	7	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
13	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DISTRIBUCION		SAN ISIDRO
14	ANGEL VILCAYURI TORRICO	3	ROGER GARCIA ANAYA		4300=OBRAS MEDIA TENSION	60316=CALIDAD DE PRODUCTO	URB. VIFEPE MZ. E - LT. 20 Y 21	SUPUR
15	MARCO ANTONIO LAPA MACHUCA	25	WILLIAM MEDINA ALBERCO		4301=OBRAS BAJA TENSION	60254=SUPERVISION SOLICITUDES Y REFORMAS	AV MARCO PUENTE LLANOS U.I. 1 PS.1	ATE
16	TONY LENIN AZCARATE MENDEZ	25	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	GARCILAZO DE LA VEGA 627	CHICLA
17	JULIO MAX CHIMAYCO YOPAS	38	JEAN PAUL HUAMAN RIOS		4300=OBRAS MEDIA TENSION	60262=SUPERVISION CONEXIONES MT Y AFECTA	AV HUAYLAS SN	SAN ISIDRO
18	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	7	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DISTRIBUCION		SAN ISIDRO
19	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	9	KELVIN VALENZUELA VERA		4440=OPERACIONES CAÑETE	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
20	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
21	JAVIER RAUL GOMEZ MAMANI	33	ROGER GARCIA ANAYA		4300=OBRAS MEDIA TENSION	60316=CALIDAD DE PRODUCTO	URB. VIFEPE MZ. E - LT. 20 Y 21	SUPUR
22	PAOLA ARTICA CONDONI	47	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60246=OBRAS DE TERCEROS Y ELECTRIFICACION		IMF
23	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MANTENIMIENTO INSTALACIONES BT Y		VILLALBA
24	LUIS LIZANA HUAMAN	6	PAUL SALINAS LAZO		4440=OPERACIONES CAÑETE	60244=PROYECTOS	PSJ AVILA MZ 27 LT 1	MA
25	LUIS LINARES POSADAS	22	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	CUIDAD DE DIOS ZONA "A" JR. TIRADO	SAN ISIDRO
26	CARLOS ENRIQUE JARAMILLO SANCHEZ	40	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT		CHICLA
27	ALLEN MARTIN HUAMAN CORAL	35	MARCO ESPERILLA CACERES		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	FRANCISCO MASIAS 545 INT A	SAN ISIDRO
28	DANIEL EDGAR SANCHEZ RUIZ	9	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60246=OBRAS DE TERCEROS Y ELECTRIFICACION		SAN ISIDRO
29	SANTOS TAICA GUTIERRES	15	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN		4220=EMERGENCIA Y ALUMBRADO	60142=DIRECCION Y CONTROL SISTEMA BT	M PARADO DE BELLIDO 445CHORRILLO	CHICLA
30	SANTOS ANDRES HOYOS CHAVEZ	1	VICTOR CHIRITO MILLONES		4301=OBRAS BAJA TENSION	60244=PROYECTOS	MZ M LT 45 URB ALPAMAYO	ATE


Hojas: Hoja1 Hoja2 Hoja3

► Filtros activados sobre la fila de encabezados del reporte.

19 Ubicar/crear la carpeta y el archivo BASE en el disco Z

Ir al disco compartido **Z: (varios)** → **[carpeta con tu nombre]** → **POSTES**. Ahí conviven el Excel **BASE** (donde se pegan las SST filtradas) y el Excel **POSTES** (el Excel maestro de control).

Si el archivo BASE no existe todavía, se crea vacío dentro de esa misma carpeta.



► Carpeta **POSTES** en disco **Z** con los archivos de trabajo.


20 Filtrar por CR TECSUR (4230 y 4440) y copiar las SST a BASE

En el Reporte SAD, filtrar la columna **CR TECSUR** dejando solo **4230 = MANTENIMIENTO DISTRIBUCION** y **4440 = OPERACIONES CAÑETE**.

Ubicarse en la primera SST filtrada, presionar **Ctrl + Shift + ↓** para seleccionar todas las visibles, copiar y pegarlas en la columna A del Excel **BASE**.

SSTS	Contrata	Responsable	Cant.	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR	CR LDS
5006740	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5007372	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5009719	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	JEANCARLO DE LA CRUZ SANCHEZ	3	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60244=PR
5005976	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006082	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006807	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	7	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5007351	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5007375	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	7	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5007376	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	9	KELVIN VALENZUELA VERA		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5006096	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
4001307	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	PAOLA ARTICA CONDORI	47	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60246=OB
5006046	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
3972161	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	LUIS LIZANA HUAMAN	6	PAUL SALINAS LAZO		4440=OPERACIONES CAÑETE	60244=PR
3989997	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	DANIEL EDGAR SANCHEZ RUIZ	9	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60246=OB
5006853	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006322	ENCOSA S.A.C.	HUGO JAIME SALAS GIRON	52	EDUARDO FRANCISCO RABINES ROD		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006080	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
3972743	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	2	EDUARDO FRANCISCO RABINES ROD		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006022	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5005992	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5007520	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	LUIS ALBERTO CASTILLO FLORES	6	LUIS TITO TOC		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5007514	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	9	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
3977175	ENCOSA S.A.C.	LUIS ENRIQUE TACO LUJAN	39	PEDRO RIVERA TARAZONA		4440=OPERACIONES CAÑETE	60246=OB
5012628	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	RAUL RONCAL CORDOVA	32	JORGE REMIGIO PALACIOS		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5007368	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	KENIDE HUAMAN VILCAPUMA	8	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5006821	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5006017	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	4	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA
5009202	PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	WILLIAMS AMADO PARIQUA MEJIA	2	KELVIN VALENZUELA VERA		4440=OPERACIONES CAÑETE	60137=OP
5005985	ENCOSA S.A.C.	ALEXANDER ARGANDOÑA MAMANI	6	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA		4230=MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	60134=MA

► Filtro de **CR TECSUR** aplicado (4230 y 4440).

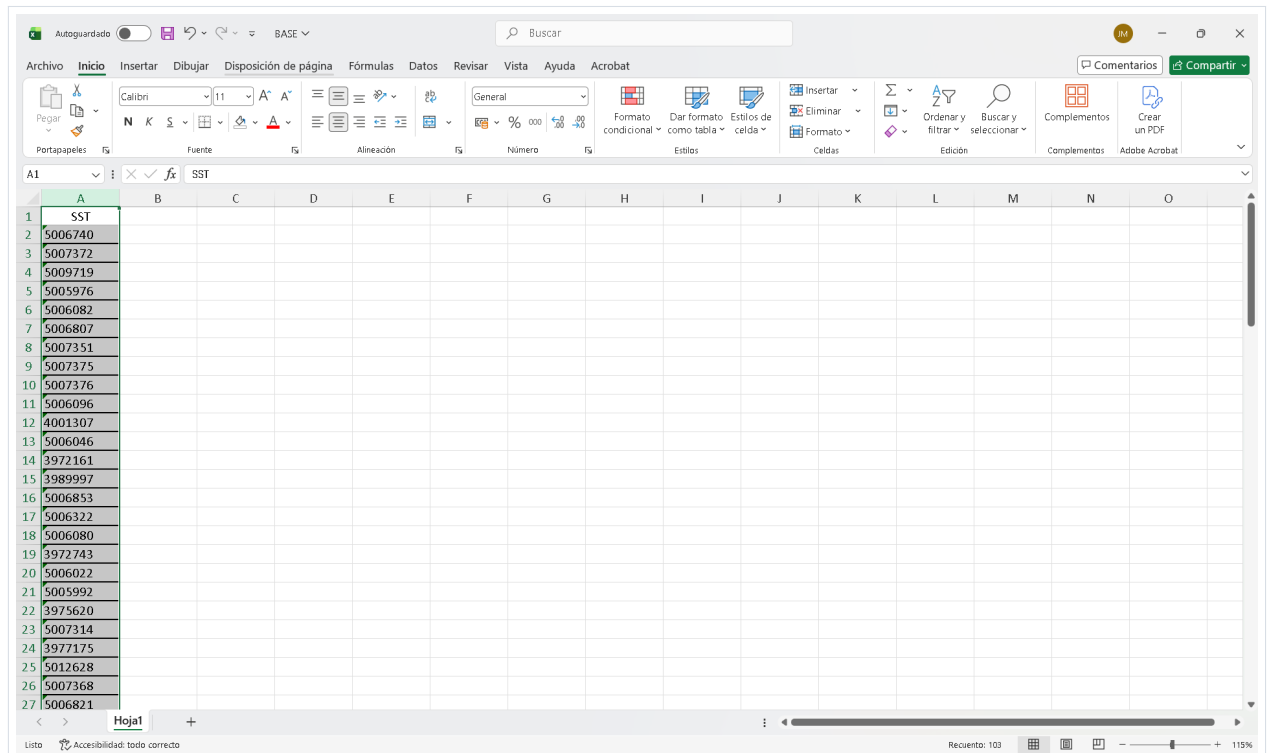

► SST pegadas en la columna A del Excel BASE.

21 Guardar y cerrar el Excel BASE

Guardar el archivo BASE.xlsx en su ubicación (Z:\...\POSTES) y cerrarlo.

22 Abrir Citrix SPO2

En el escritorio, doble clic en el acceso directo «**citrixspo2**» para abrir la sesión remota.




► Acceso directo a CITRIXPO2 en el escritorio.

23 Copiar el Excel BASE hacia la carpeta local del Citrix

Dentro de Citrix, copiar el Excel BASE desde la carpeta de red (Z:) hacia la carpeta local de la PC remota (C:\...\Documentos\[usuario]), ya que SISTEC solo puede leer archivos del disco local de esa PC remota.

Una vez copiado, ese archivo se usará más adelante en el proceso de carga masiva.

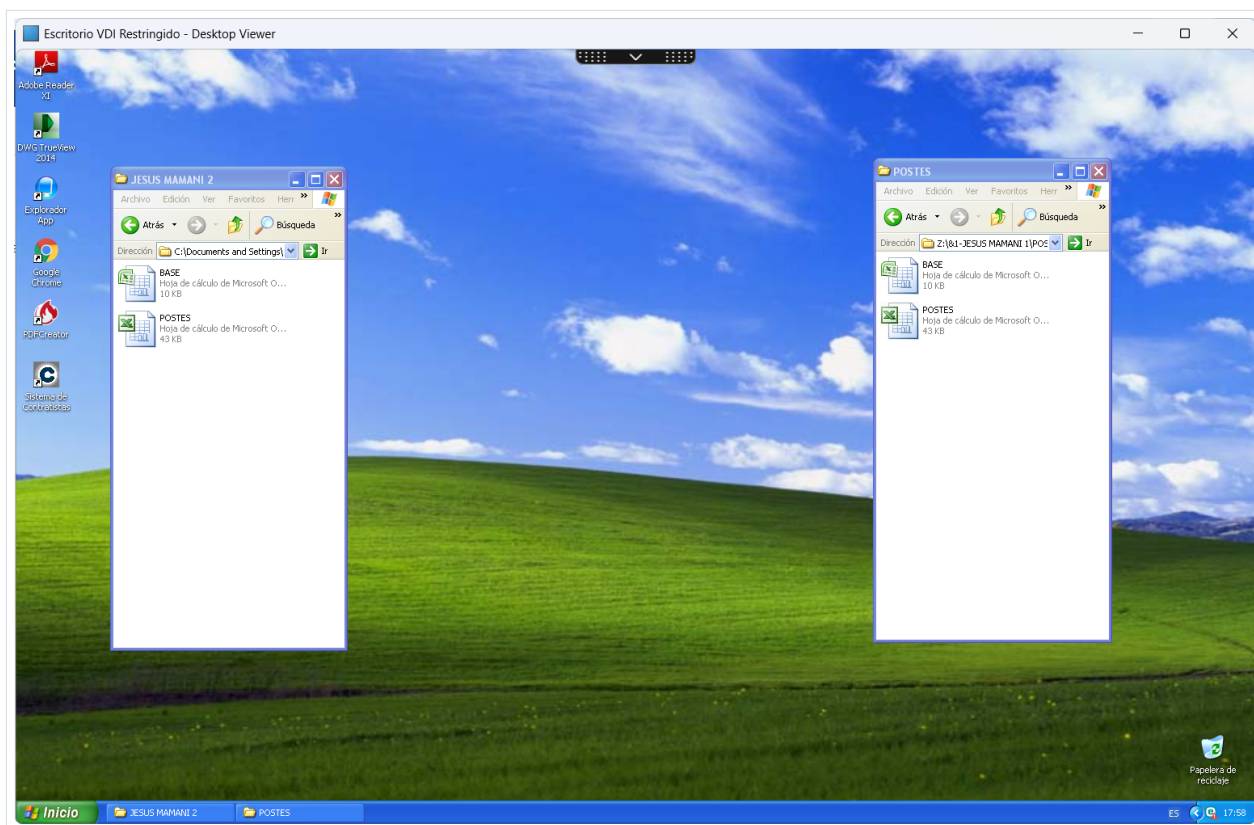

► Ventanas del explorador remoto: carpeta local (izquierda) y carpeta de red Z (derecha).

23 Ejecutar Sistema de Contratistas


Clic en el ícono «**Sistema de Contratistas**» y seleccionar Ejecutar.



► Ícono Sistema de Contratistas dentro de Citrix.

24 Abrir el Sistema-Recurso SISTEC SPO


En la ventana AVBMenu, hacer click en "Archivos" y luego en "Abrir", se abrirá «Abrir Sistema-Recurso», seleccionar **SISTEC SPO** de la lista y clic en OK.

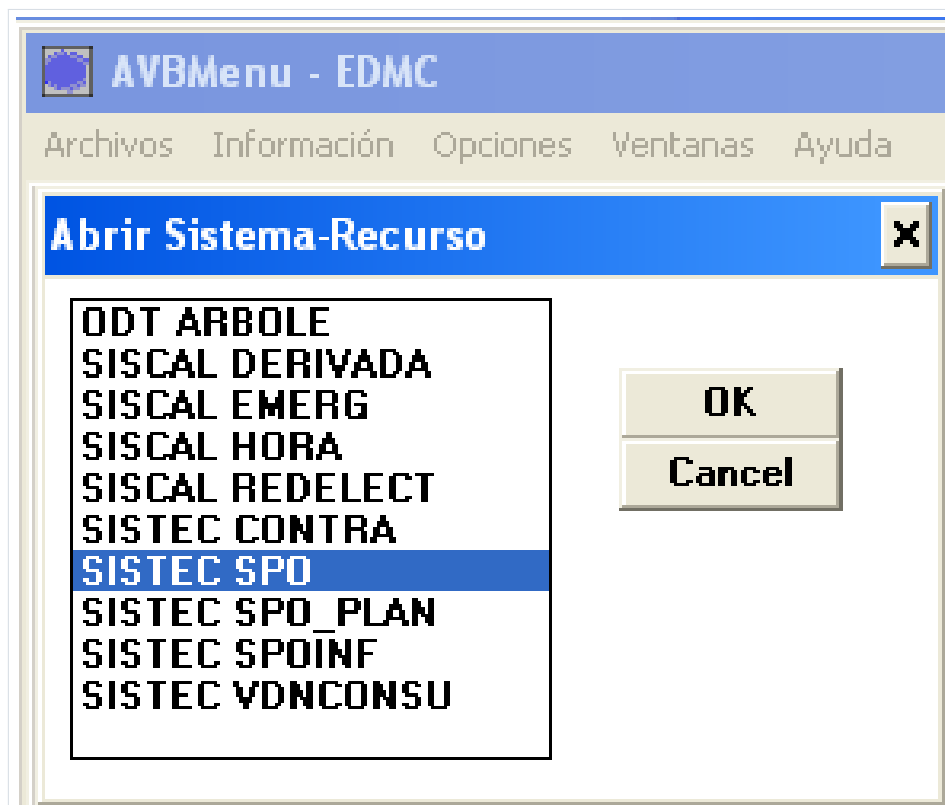

► Selección de SISTEC SPO en la ventana de recursos.

25 Entrar a Reportes Personalizados


Navegar: SISTEC → Solicitudes → Estadísticas → **Reportes Personalizados**, y hacer doble clic.

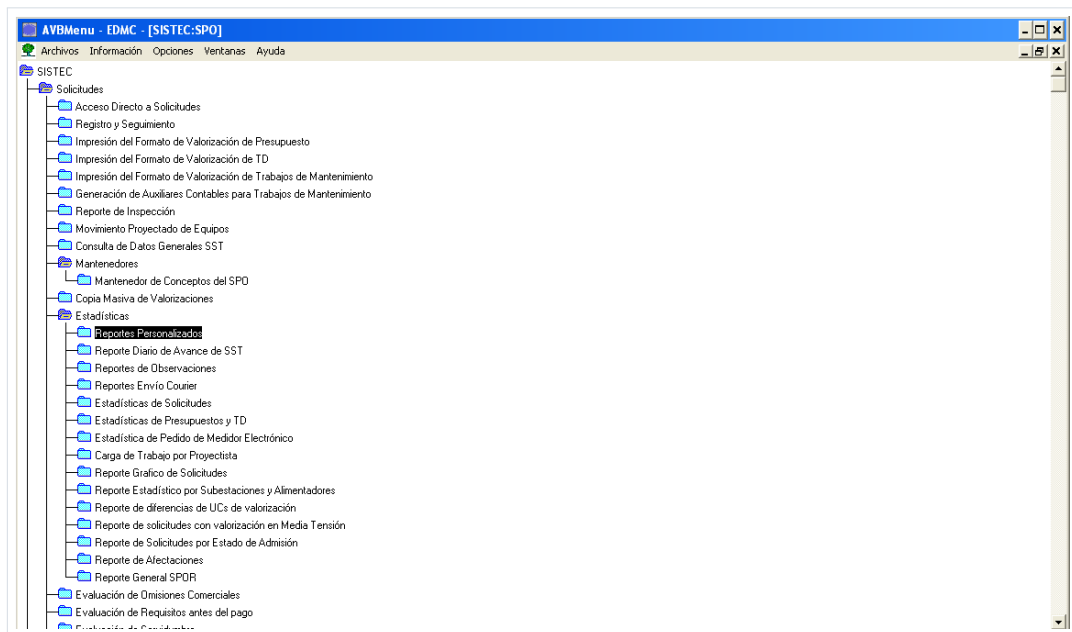

► Árbol de SISTEC: Solicitudes → Estadísticas → Reportes Personalizados.

26 Cargar la configuración de reporte «POSTE»


En la ventana de Selección de Campos, clic en **Leer Configuración**. Escribir «**POSTE**» en el buscador y clic en Leer.

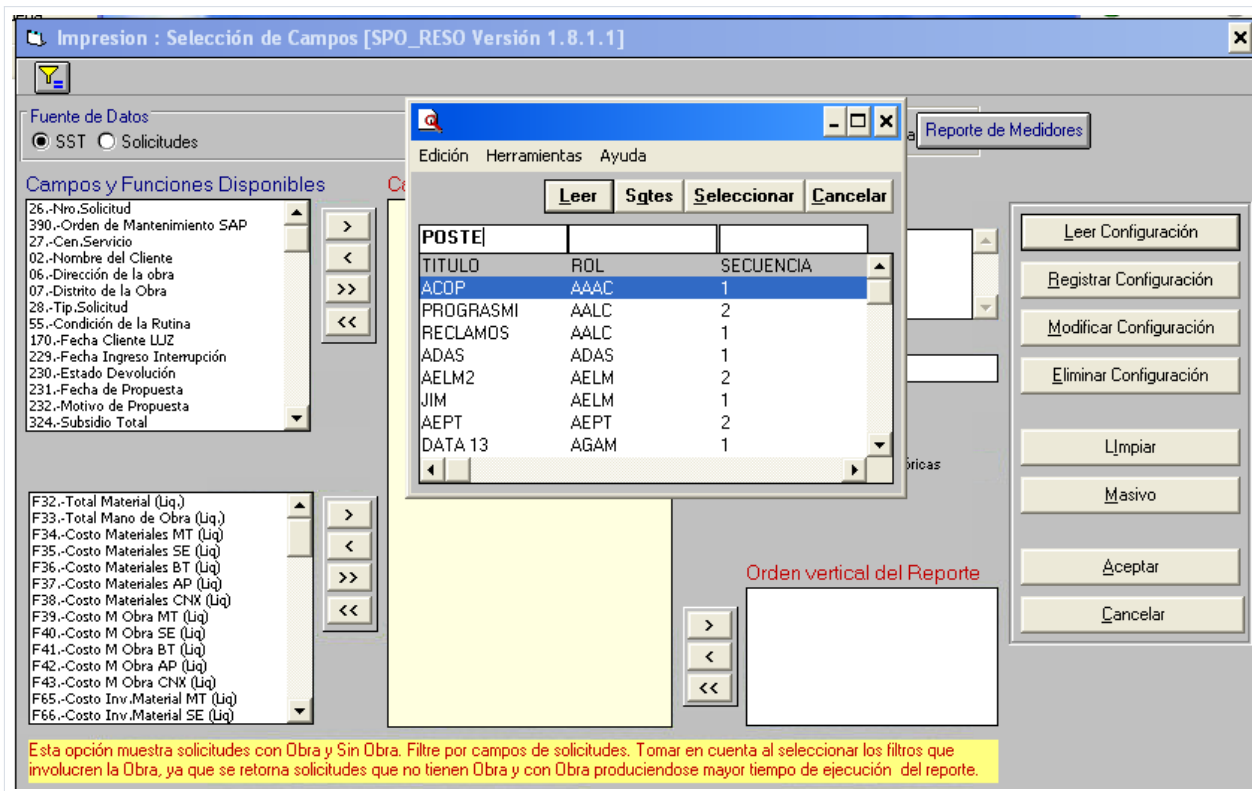

► Ventana de búsqueda de configuraciones guardadas.

27 Seleccionar la configuración POSTES

De los resultados («POSTES – RGAA – 5» y «POSTES – SMD – 1»), doble clic en el **primer título** de la lista.

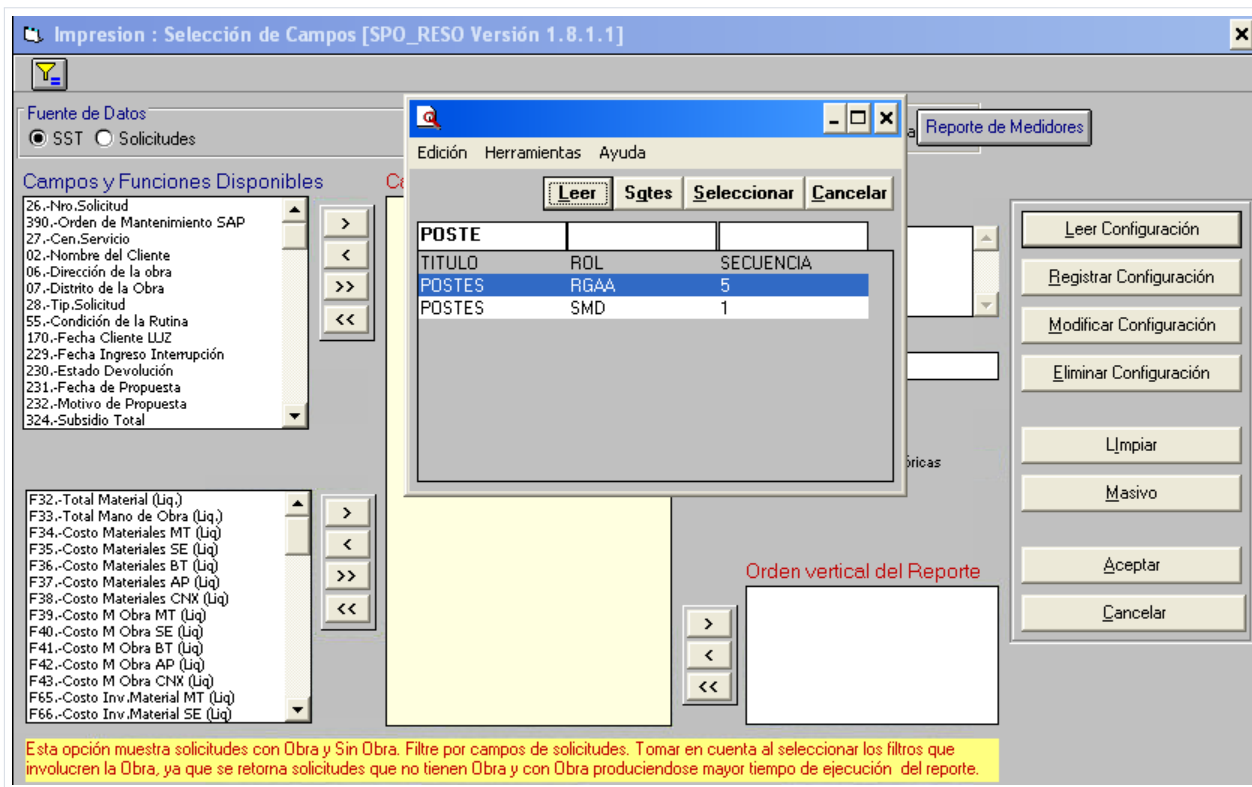

► Lista de configuraciones POSTES encontradas.

28 Verificar los 18 campos a imprimirse

Confirmar que la lista de «Campos a Imprimirse» incluya exactamente: Nro.Solicitud, Distrito de la Obra, Fecha Inicio/Fin Programado, Etapa, Etapa Obra Tecsur/LDS, Fecha Inicio/Fin Real, Fecha Últ. Envío a Tecsur, CR Tecsur, Técnico Tecsur, Nombre Contratista, Actividad Tecsur, Capataz/Encargado Obra, Fecha Foto Fin de Obra, Nombre Actividad Operativa, Nombre Macroactividad Operativa y Código Poste.


Campos a Imprimirse

26.-Nro.Solicitud
07.-Distrito de la Obra
37.-Fecha Inicio Programado
38.-Fecha Finalizacion Programado
44.-Etapa
155.-Etapa Obra Tecsur/LDS
39.-Fecha Inicio Real
40.-Fecha Finalizacion Real
51.-Fecha Ult Envio a Tecsur
97.-Cr Tecsur
150.-Tecnico Tecsur
153.-Nombre Contratista
171.-Actividad Tecsur
260.-Capataz/Encargado Obra
261.-Fecha Foto Fin de Obra
264.-Nombre Actividad Operativa
265.-Nombre Macroactividad Operativ
266.-Código Poste

► Los 18 campos que debe traer la configuración POSTES.

29 Cargar en modo Masivo — Excel por solicitud

Con los campos cargados, clic en **Masivo**. En «Seleccione tipo Carga» dejar marcado **Excel por solicitud** y Aceptar.

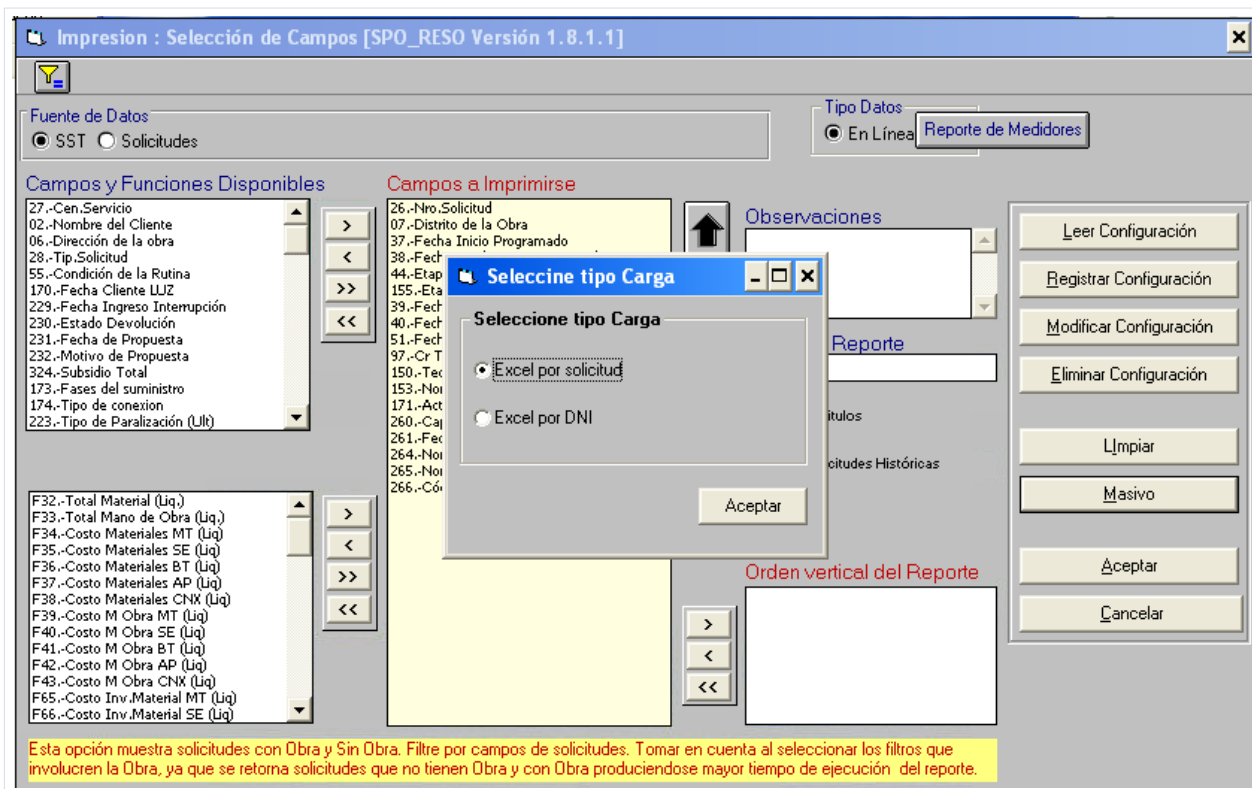

Impresión : Selección de Campos [SPO_RESO Versión 1.8.1.1]

Fuente de Datos
☒ SST ☐ Solicitudes

Tipo Datos
☒ En Línea ☐ Reporte de Medidores

Campos y Funciones Disponibles

- 27.-Cen.Servicio
- 02.-Nombre del Cliente
- 06.-Dirección de la obra
- 28.-Tip.Solicitud
- 55.-Condición de la Rutina
- 170.-Fecha Cliente UJ2
- 229.-Fecha Ingreso Interrupción
- 230.-Estado Devolución
- 231.-Fecha de Propuesta
- 232.-Motivo de Propuesta
- 324.-Subsidio Total
- 173.-Fases del suministro
- 174.-Tipo de conexión
- 223.-Tipo de Paralización (Ult)

Campos a Imprimirse

- 26.-Nro.Solicitud
- 07.-Distrito de la Obra
- 37.-Fecha Inicio Programado
- 38.-Fech
- 44.-Etap
- 155.-Eta
- 39.-Fech
- 40.-Fech
- 51.-Fech
- 97.-Cr T
- 150.-Tec
- 153.-Noi
- 171.-Act
- 260.-Caj
- 261.-Fech
- 264.-Noi
- 265.-Noi
- 266.-Cón

Observaciones

Reporte

Orden vertical del Reporte

Seleccine tipo Carga

Seleccione tipo Carga

☒ Excel por solicitud

☐ Excel por DNI

Aceptar

Leer Configuración

Registrar Configuración

Modificar Configuración

Eliminar Configuración

Llmpiar

Masivo

Aceptar


Cancelar

Esta opción muestra solicitudes con Obra y Sin Obra. Filtre por campos de solicitudes. Tomar en cuenta al seleccionar los filtros que involucren la Obra, ya que se retorna solicitudes que no tienen Obra y con Obra produciéndose mayor tiempo de ejecución del reporte.

► Ventana Masivo: tipo de carga Excel por solicitud.

30 Ubicar y seleccionar el archivo BASE


En «Ubicar Archivo carga», navegar hasta la carpeta local (c:\...\misdoc~1\[usuario]) y seleccionar **BASE~1.XLS**. Verificar que el tipo de archivo sea Excel (*.xls) y Aceptar.

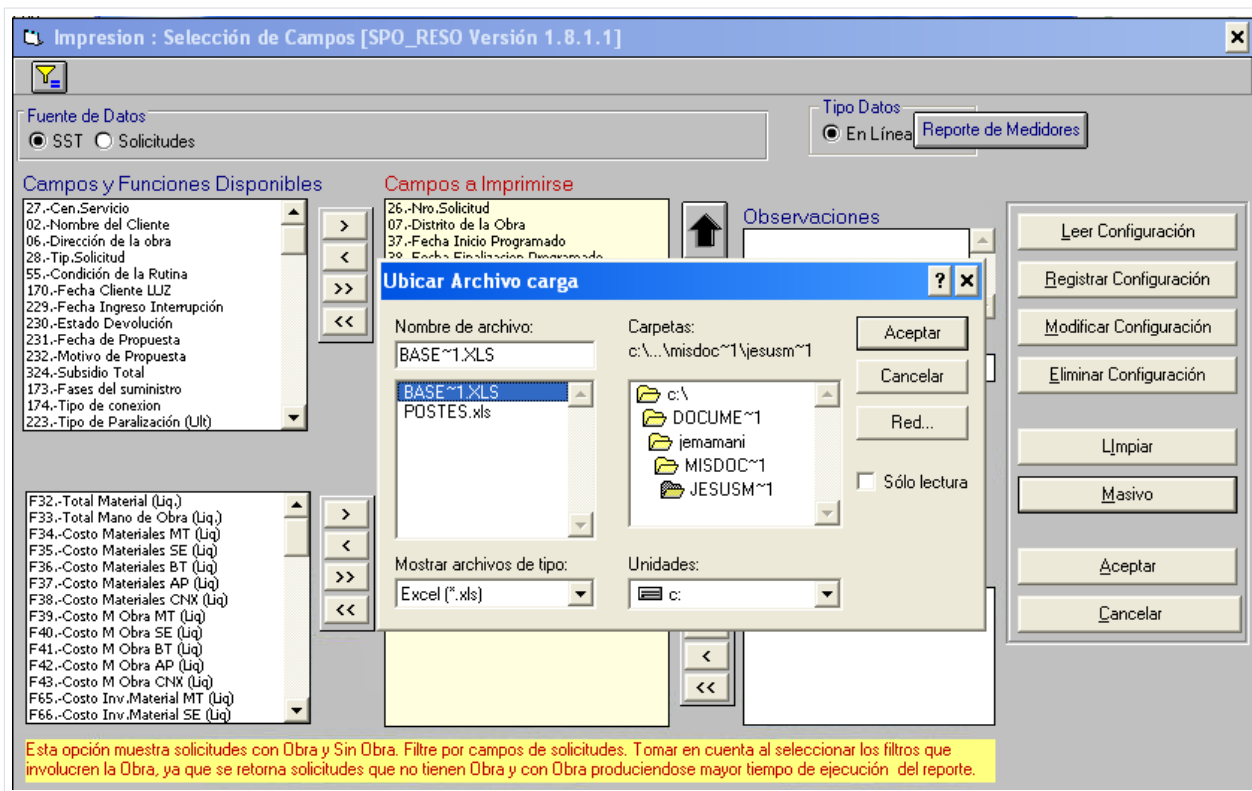

► Selección del archivo BASE~1.XLS en la carpeta local.

31 Exportar como Excel con Formato


Ahora hacer click en "Aceptar", el boton que está debajo de "Masivo" se abrirá: «Tipo de Reporte a Exportar», dejar marcado **Excel con Formato** y clic en los tres puntos (...) para elegir la ubicación.

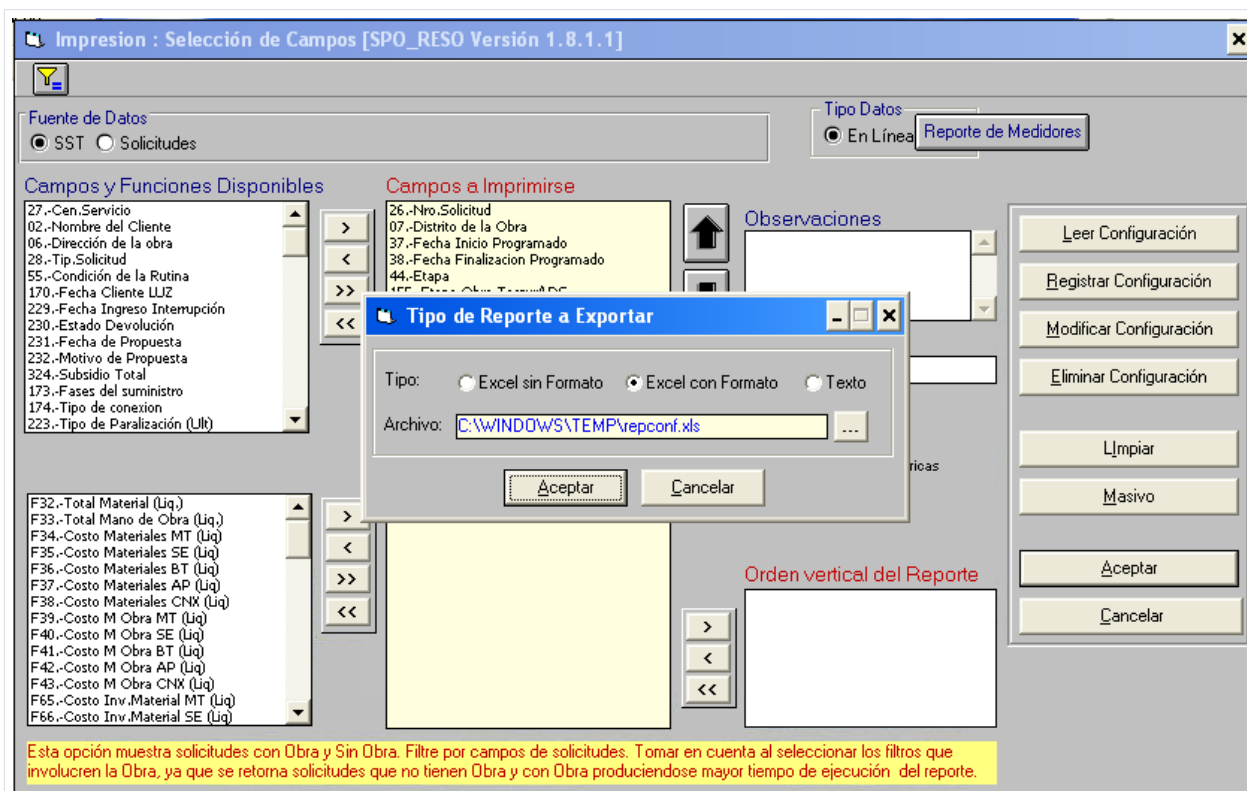

► Ventana Tipo de Reporte a Exportar.

32 Guardar como «POSTES.xls»

En «Guardar como», navegar a la carpeta local, escribir **POSTES.xls** como nombre y Aceptar. Confirmar «Sí» si pide reemplazar el archivo existente.

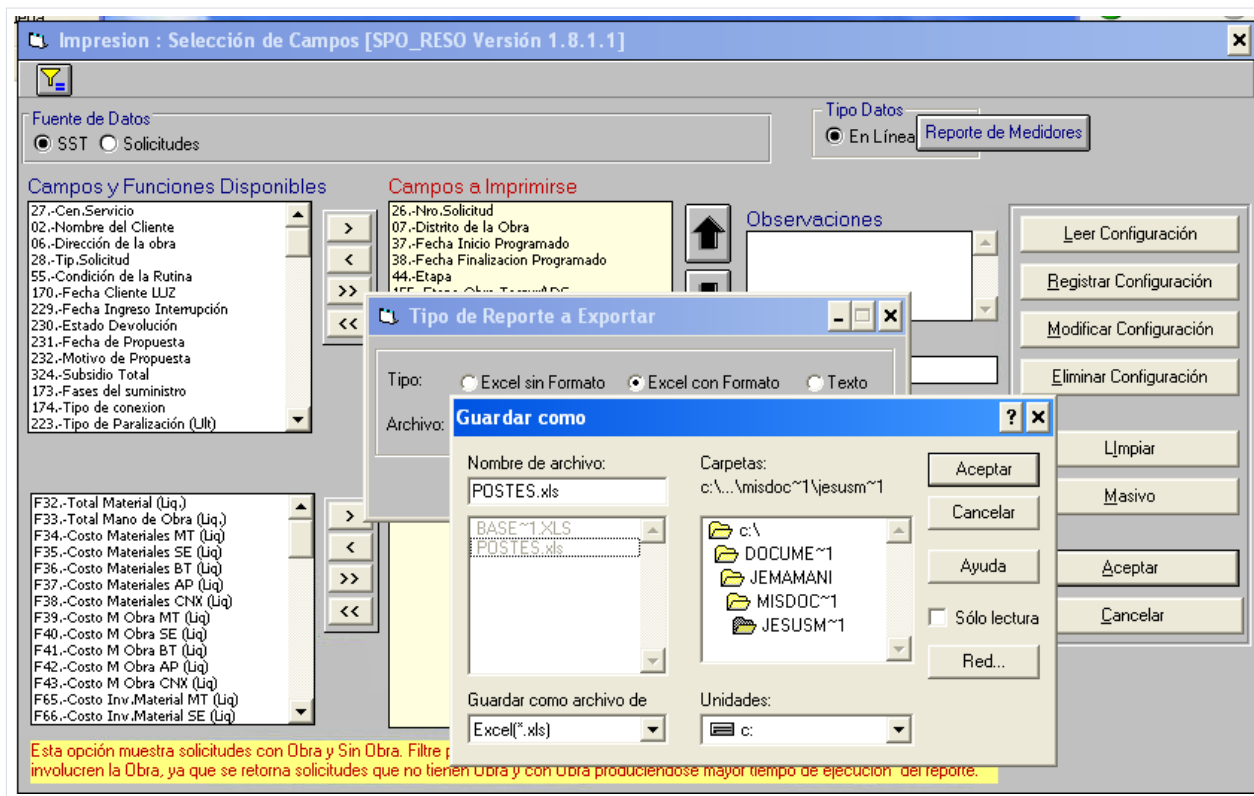


► Guardando el reporte como POSTES.xls en la carpeta local.

33 Cerrar y transferir el Excel POSTES generado

El archivo POSTES.xls se abre automáticamente por defecto: cerrarlo.

Arrastrar el archivo desde la carpeta local del Citrix hacia la carpeta de red (Z:\...\POSTES) en la PC real, para dejar la base descargada disponible fuera del entorno remoto.

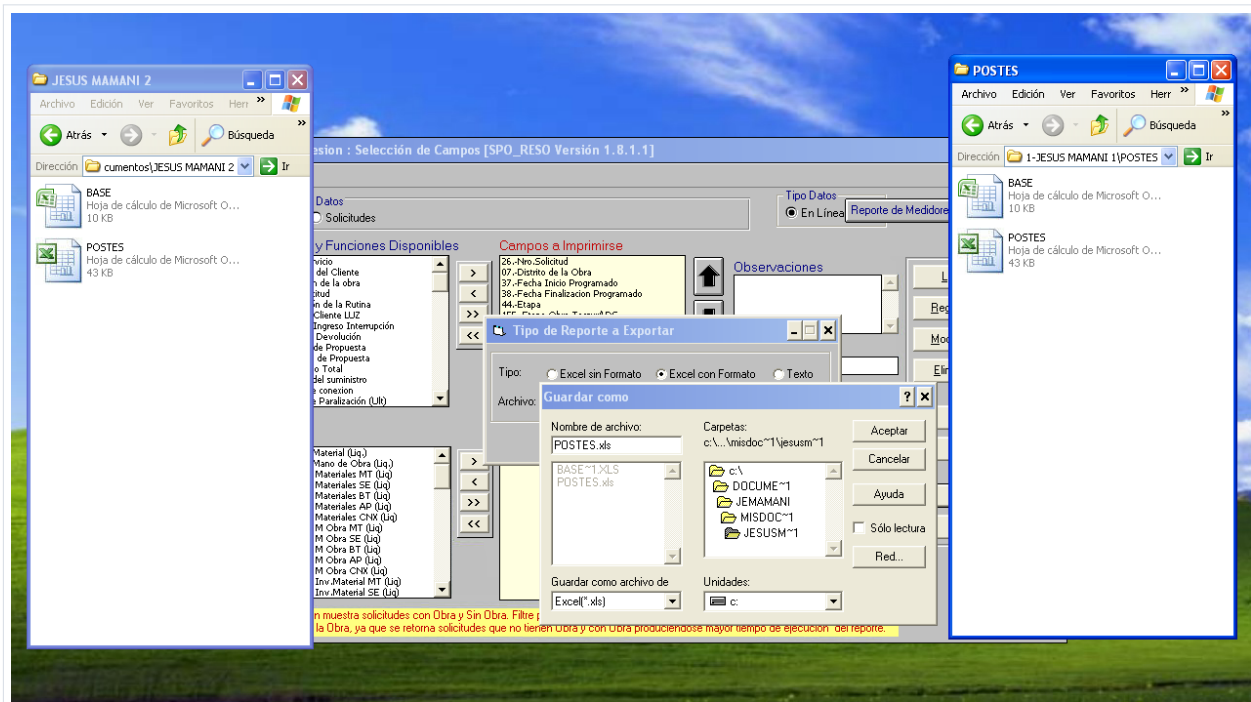


► Transferencia de archivo de postes de CITRIX hacia ordenador principal.

34 Confirmar y abrir el nuevo POSTES en la PC real

En la PC real, ir a Disco Z → carpeta personal → POSTES. El archivo **POSTES.xlsx** aparece actualizado (mayor tamaño, hora reciente).

Abrirlo para continuar el proceso. **Cuidado:** no confundir este «POSTES.xlsx» (reporte SISTEC recién descargado) con el Excel maestro «Control de postes DD.MM.26» de la Parte 1; ambos coexisten en la misma carpeta.



► Carpeta POSTES en disco Z con el archivo recién actualizado (162 KB).

35 Separar el código SST con Texto en columnas


Insertar dos columnas nuevas a la derecha de la columna A. Seleccionar la columna A (SOLICITUD, ej. «60134 -M -3740890-1»).

Ir a **Datos** → **Texto en columnas**, elegir **De ancho fijo** y avanzar.

En el paso 2 del asistente, marcar manualmente los saltos de columna en las posiciones donde se separan los segmentos del código, y Finalizar.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	SOLICITUD													
2	60134 -M -3740890-1		DIS. OBRA	INI. PROG.	FIN PROG.	ETP	EP2		INI. REAL	FIN REAL	JLT. ENVIO TS	CR TECUR	Tec. Tecsur	Nom. Contrat Actividad Te
3	60134 -M -3861208-1		3=ATE-VITAR	08/01/2026	31/01/2026	E	E	07/02/2025	07/02/2025	4230	JOAO	PROCESOS PR	11104000	
4	60134 -M -3866608-1		75=SAN BART	08/01/2026	31/03/2026	E	E	18/09/2025	18/09/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR		
5	60134 -M -3873064-1		99=PACARAN	08/01/2026	31/03/2026	E	E	27/09/2025	27/09/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR		
6	60134 -M -3944508-1		81=SANTA CR	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025	10/10/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR		
7	60137 -M -3972626-1		29=SAN JUAN	19/03/2026	20/04/2026	E	E	19/03/2026	19/03/2026	4230	LUTT	CAMPOS LAT/	11104000	
8	60137 -M -3972874-1		102=SAN VICE	21/05/2026	05/08/2026	E	E	21/05/2026	20/05/2026	4440	JREP	GCI	11104000	
9	60134 -M -3973212-1		3=ATE-VITAR	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026	20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSA		
10	60244 -O -3985933-1		35=VILLA MAI	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026	20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSA		
11	23504 -O -3990512-1		102=SAN VICE	10/07/2026	16/07/2026	E	E	10/07/2026	09/07/2026	4440	WYPR	GCI		
12	60244 -TD -3992855-1		101=NUEVO I	14/07/2026	20/07/2026	E	E	14/07/2026	13/07/2026	4440	KFMA	ENCOSA		
13	60137 -CP -3996431-1		90=MALA	02/07/2026	13/07/2026	E	E	02/07/2026	01/07/2026	4440	WYPR	GCI		
14	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
15	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
16	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
17	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
18	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
19	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
20	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
21	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
22	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
23	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		
24	60137 -CP -3996431-1		101=NUEVO I	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR		

► Datos crudos de la hoja SOLICITUD antes de separar.

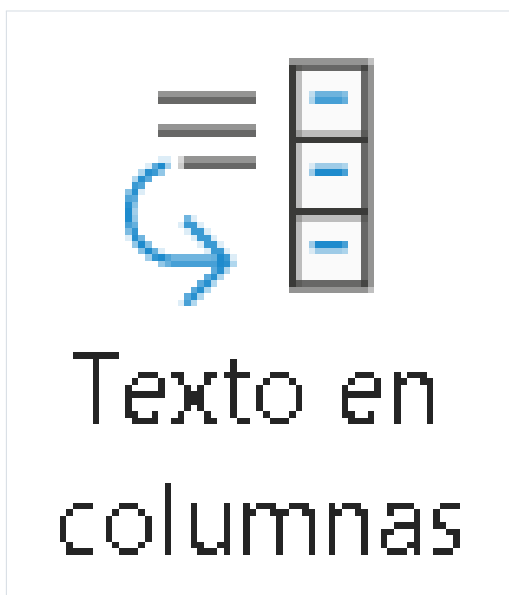

► Herramienta Texto en columnas.



► Opción De ancho fijo.

Asistente para convertir texto en columnas - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer el ancho de los campos (saltos de columna).
Las líneas con flechas indican un salto de columna.

Para CREAR un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada.
Para ELIMINAR un salto de línea, haga doble clic en la línea.
Para MOVER un salto de línea, haga clic y arrástrelo.

Vista previa de los datos

	10	20	30	40	50	60	70	80
60134-M-3740890-1								
60134-M-3740490-1								
60134-M-3740590-1								
60134-M-3760890-1								
60134-M-3740800-1								

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

► Asistente, paso 2: marcado manual de los saltos de columna.

36 Eliminar las columnas sobrantes

Tras la separación quedan columnas intermedias no necesarias. Seleccionarlas y eliminarlas, dejando solo la columna con el número real de SST limpio.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	SOLICITUD				INI.PROG.	FIN PROG.	ETP	EP2	INI.REAL	FIN REAL	JLT.ENVIOS	CR TICSUR	Tec. Tecsur	Nom. Contrat	Actividad Te
2	60134	-M -	3740890	-1	08/01/2026	31/01/2026	E	E	07/02/2025		07/02/2025	4230	JOAO	PROCESOS PR	11104000
3	60134	-M -	3861208	-1	08/01/2026	31/03/2026	E	E	18/09/2025		18/09/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR	
4	60134	-M -	3866608	-1	08/01/2026	31/03/2026	E	E	27/09/2025		27/09/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR	
5	60134	-M -	3873064	-1	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025		10/10/2025	4230	JAIA	PROCESOS PR	
6	60134	-M -	3944508	-1	19/03/2026	20/04/2026	E	E	19/03/2026		19/03/2026	4230	LUTT	CAMPOS LAT	11104000
7	60137	-M -	3972626	-1	21/05/2026	05/08/2026	E	E	21/05/2026		20/05/2026	4440	JREP	GCI	11104000
8	60134	-M -	3972874	-1	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026		20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSA	
9	60134	-M -	3973212	-1	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026		20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSA	
10	60244	-O -	3985933	-1	10/07/2026	16/07/2026	E	E	10/07/2026		09/07/2026	4440	WYPR	GCI	
11	23504	-O -	3990512	-1	14/07/2026	20/07/2026	E	E	14/07/2026		13/07/2026	4440	KFMA	ENCOSA	
12	60244	-TD-	3992855	-1	02/07/2026	13/07/2026	E	E	02/07/2026		01/07/2026	4440	WYPR	GCI	
13	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
14	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
15	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
16	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
17	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
18	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
19	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
20	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
21	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
22	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
23	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	
24	60137	-CP-	3996431	-1	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026		09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PR	

► Resultado de la separación: columnas de relleno listas para eliminar.

37 Cruzar SST con BUSCARV usando el POSTES.xls del Citrix

En el archivo **REPORTE_SAD_OBRASBT** (ya filtrado por CR TECSUR), insertar una columna después de la A y colocar la fórmula:

```
=BUSCARV(A4; [POSTES.xls]Hoja1!$1:$65536;16;)
```

Esto busca cada SST dentro del POSTES.xls descargado del Citrix y trae el **nombre específico de la actividad** (ej. «Cambio de poste accesible», «Programa de reforzamiento de postes»).

IMPORTANTE: Filtrar en esta nueva columna creada, la palabra "POSTE", y solo quedarnos con los que necesitamos. Eliminamos "Programa de reforzamiento de postes", "Reforzamiento de psotes de MT en caliente", etc...

A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
REPORTE DE ATENCIONES	SST	Contratasta	Responsable	Cant. Fotos	Supervisor Tecsur	Proyectista L
3123021	=BUSCARV(A3;[POSTES.xls]Hoja1!\$1:\$65536;16;)	DANIEL EDGAR SANCHEZ RUIZ	22	LUIS PERCY CARDENAS MENDOZA		
5006271		ENCOSA S.A.C.	EUSEBIO SALAZAR VILCA	2	JOEL VILLA DIAZ	
5017151		ENERGIA Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.	JEAN PIERRE LOPEZ PIZARRO	6	JOEL VILLA DIAZ	
5010540		NATURAL GAS COMPANY S.A.C.	RINOEL ESPINOZA PARDO	5	VICTOR CHIRITO MILLONES	
3998780		CAMPOS LATAM S.A.C. - CAMPOS LATAM	JESUS ALEJANDRO BEJARANO SEGUR	3	LUIS TITO TOCRE	
3972124		ENCOSA S.A.C.	JUVENAL LAURA NAVARRO	10	RAFAEL ALBERTO TOLEDO QUIROZ	
3993410		NATURAL GAS COMPANY S.A.C.	ALEXIS CARDENAS OTAZU	6	LUIS TITO TOCRE	
5015105		PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	DAVID RAMIREZ FERNANDEZ	60	ELVIS CHILENO DIAZ	
3947009		ENERGIA Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.	FELIPE GRANDEZ AMASIFUEN	26	FREDDY HERNANDEZ LOPEZ	
5006071		ENCOSA S.A.C.	JOSE DANIEL HUAPAYA SUELDO	36	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA	
5018250		GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	NOE GARCIA SALVADOR	15	LUIS VERA HORNA	
3999149		PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	ELIAS VELARDE SULCA	1	HANS ERNESTO REAÑO LEON	
5002717		ENERGIA Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.	JEAN PIERRE LOPEZ PIZARRO	7	JOEL VILLA DIAZ	
5016886		ENCOSA S.A.C.	JORGE ALBERTO MERCADO CORTEZ	8	MANUEL MUÑOZ UCAÑAN	
3919403		GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	ELIAS HUACHO ROJAS	19	TONY MEJIA AGUIRRE	
3996190		NATURAL GAS COMPANY S.A.C.	HERLESS WILLIAM ALVAREZ ORTEGA	11	LUIS TITO TOCRE	
5017702		GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	ELISEO GUILLERMO CHAVEZ	5	LUIS VERA HORNA	
5006028		ENCOSA S.A.C.	OSCAR GONZALES SANCHEZ	5	MAYCOL ALTAMIRANO ZUÑIGA	
5009121		ENERGIA Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.	JUAN SANTIAGO MORIMONTALVO	1	HANS ERNESTO REAÑO LEON	
3990318		PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	ROY HANS SALCEDO RODRIGUEZ	21	SAMUEL ALEJANDRO VALENCIA AZU	
3996212		NATURAL GAS COMPANY S.A.C.	HERLESS WILLIAM ALVAREZ ORTEGA	2	LUIS TITO TOCRE	
3961813		ENCOSA S.A.C.	LUIS ENRIQUE TACO LUJAN	5	JOSE FERNANDO VALENCIA HUAYTA	
5002150		ENCOSA S.A.C.	IHON SOTO FLORES	3	SAMUEL ALEJANDRO VALENCIA AZU	
3981811		ENERGIA Y ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS S.A.	IHONATAN INIIMA PAREDES	7	DENIS VASCO MATIAMA	

► Fórmula BUSCARV en la columna B del Reporte SAD, trayendo el nombre de actividad.

✓ LISTO

Cerrar Citrix. Con la columna de nombre de actividad ya cargada en el Reporte SAD, se cierra la sesión de Citrix y se continúa trabajando con el Reporte SAD y el archivo «Base de POSTES diario». Asimismo filtrar en esta nueva columna creaca la palabra clave "POSTE", y solo quedarnos con los que necesitamos. Eliminamos "Programa de reforzamiento de POSTES", "Reforzamiento de postes de MT en caliente.



04

PARTE

Trabajo del día y comparación final



11:20 am – 3:30 pm

PARTE 4

Trabajo del día y comparación final

• 11:20 am – 3:30 pm

El corazón del proceso. Este bloque cubre todo el trabajo de supervisión de la mañana y la tarde: se pasa la información filtrada al Excel de trabajo diario, se completa poste por poste, y a las 3:30 pm se repite el cruce con el Citrix para el cierre definitivo del día.


39 Trabajar el Excel «Base de POSTES diario» (hasta las 2:00 pm)

Pasar del REPORTE_SAD_OBRASBT (con SST, Contratista, Capataz y nombre de actividad) hacia el Excel **Base de POSTES diario**: actualizar Fecha, SST, Contratista y Capataz.

Completar **Descripción Poste Nuevo** con el tipo: **CAC** (ej. 9/200) = Concreto Armado Centrifugado, o **PRFV** (ej. 7.5/150) = Poste de Fibra de Vidrio.

Llenar el **Código Antiguo** del poste a cambiar (visible en la Plataforma de Supervisión a Distancia) y, verificando las fotos, el **Código Nuevo** del poste colocado.

Completar **Conformación de Cuadrilla** (capataz, conductor, operario, empalmador, ayudante, conductor operador), **Zona** (Accesible/Inaccesible), tipo de instalación (**Cimentada**/Enterrada) y la **hora de llegada** de la cuadrilla.

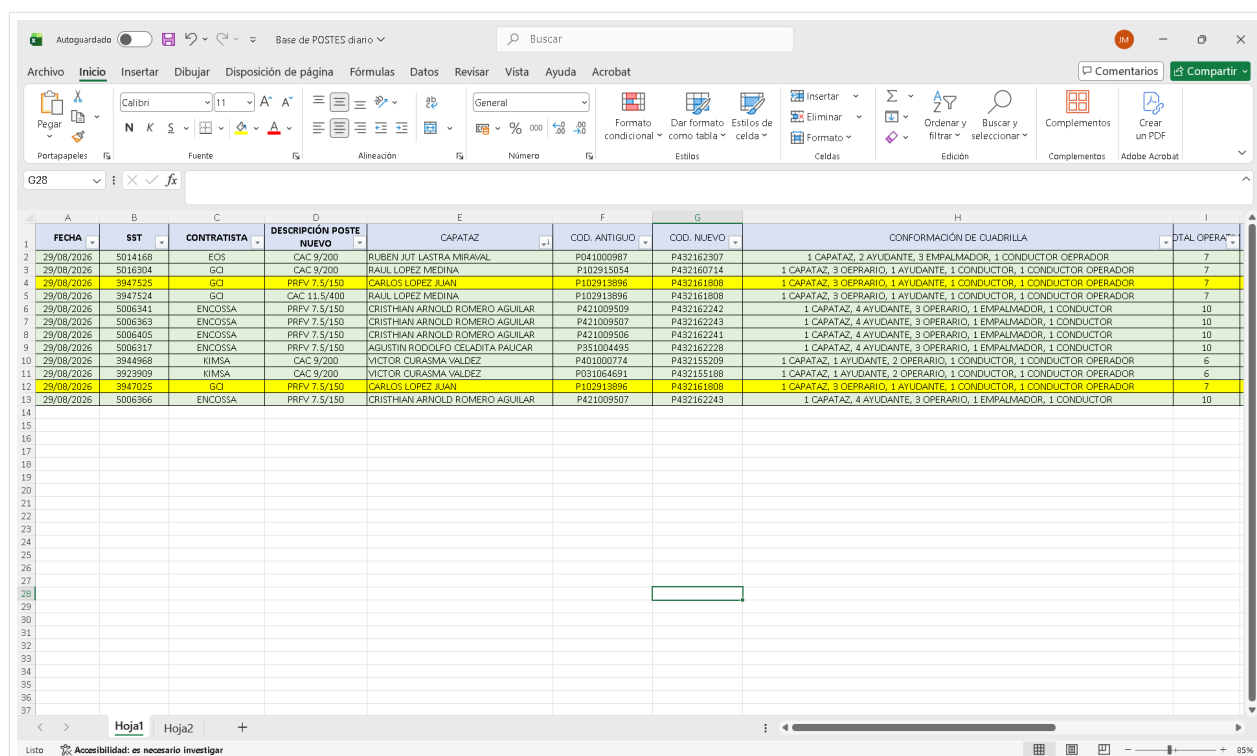

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	FECHA	SST	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN POSTE NUEVO	CAPATAZ	COD. ANTIGUO	COD. NUEVO	CONFORMACIÓN DE CUADRILLA	DTAL OPERA
1	29/08/2026	5014168	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LASTRA MIRAVIAL	P041000987	P432162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OERPADOR	7
2	29/08/2026	5016304	GCI	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P432160714	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
3	29/08/2026	3947525	GCI	PRFV 7.5/150	CARLOS LOPEZ JUAN	P102913896	P432161808	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
4	29/08/2026	3947524	GCI	CAC 11.5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913896	P432161808	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
5	29/08/2026	5006341	ENCOSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P432162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OEPARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
6	29/08/2026	5006363	ENCOSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OEPARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
7	29/08/2026	5006405	ENCOSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P432162241	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OEPARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
8	29/08/2026	5006317	ENCOSA	PRFV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351004495	P432162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OEPARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
9	29/08/2026	3944968	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CUBASMA VALDEZ	P401000774	P432155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OEPARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
10	29/08/2026	3923909	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CUBASMA VALDEZ	P351004491	P432155188	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OEPARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
11	29/08/2026	3947025	GCI	PRFV 7.5/150	CARLOS LOPEZ JUAN	P102913896	P432161808	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
12	29/08/2026	5006366	ENCOSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OEPARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10

► Base de POSTES diario con las columnas de trabajo de la supervisión.

Criterio de conteo — qué cuenta como «cambio de poste» en el día.

- **Cambio directo** (retira poste antiguo + coloca uno nuevo) → cuenta como 1 en el conteo del día.
- **Solo retiro** (sin colocar aún) → también cuenta como 1 cambio de poste ese día.
- **Retiro dejado «al aire»** (el capataz saca el poste pero deja la instalación para el día siguiente) → **no** se cuenta hoy; se contabiliza recién al día siguiente cuando se completa.

Verificación cruzada: comparar las SST recibidas de Rosmell por WhatsApp (Paso 0) contra las ya cargadas en la Base de POSTES diario. Si alguna SST enviada por Rosmell no está en la base, agregarla al final y revisarla también.

40 Segunda descarga del Reporte SAD (3:30 pm)

Volver a la Plataforma Web → Reporte Diario Sad. Repetir el filtro: Tipo Atención = «Proyectos y Mant. BT», fecha de hoy, clic en la lupa (Buscar), y descargar (botón al costado de la lupa).

41 Filtrar el nuevo reporte y actualizar la Base

Filtrar la columna CR TECSUR dejando solo 4230 y 4440, igual que en la mañana. Seleccionar todas las SST filtradas (Ctrl+Shift+↓), copiar y actualizar el Excel **BASE** en el disco Z.

42 Repetir el proceso completo de Citrix con la BASE de la tarde

Volver a Citrix (Sistema de Contratistas → SISTEC SPO → Reportes Personalizados → configuración POSTES). Reemplazar el Excel BASE local con la versión de la tarde.

Repetir Masivo → Excel por solicitud → exportar como POSTES.xls y transferirlo al disco Z, igual que en la Parte 3.


43 Repetir Texto en columnas, eliminar columnas y BUSCARV (tarde)

Con el nuevo POSTES.xls de la tarde, repetir exactamente el mismo procedimiento documentado en la Parte 3: separar el código SST con Texto en columnas, eliminar las columnas sobrantes, y aplicar el BUSCARV en el Reporte SAD de la tarde para traer el nombre de actividad de cada SST.

44 Filtrar por «POSTE» en el Reporte SAD de la tarde

En el Reporte SAD (columna B con el BUSCARV ya aplicado), filtrar por la palabra **POSTE** y considerar únicamente los que correspondan a cambio de poste real.

En el ejemplo, la lista se reduce de 336 a **26 registros**, mostrando únicamente actividades tipo «Cambio de poste accesible», «Cambio de poste inaccesible con Cabria/Vientos», etc.

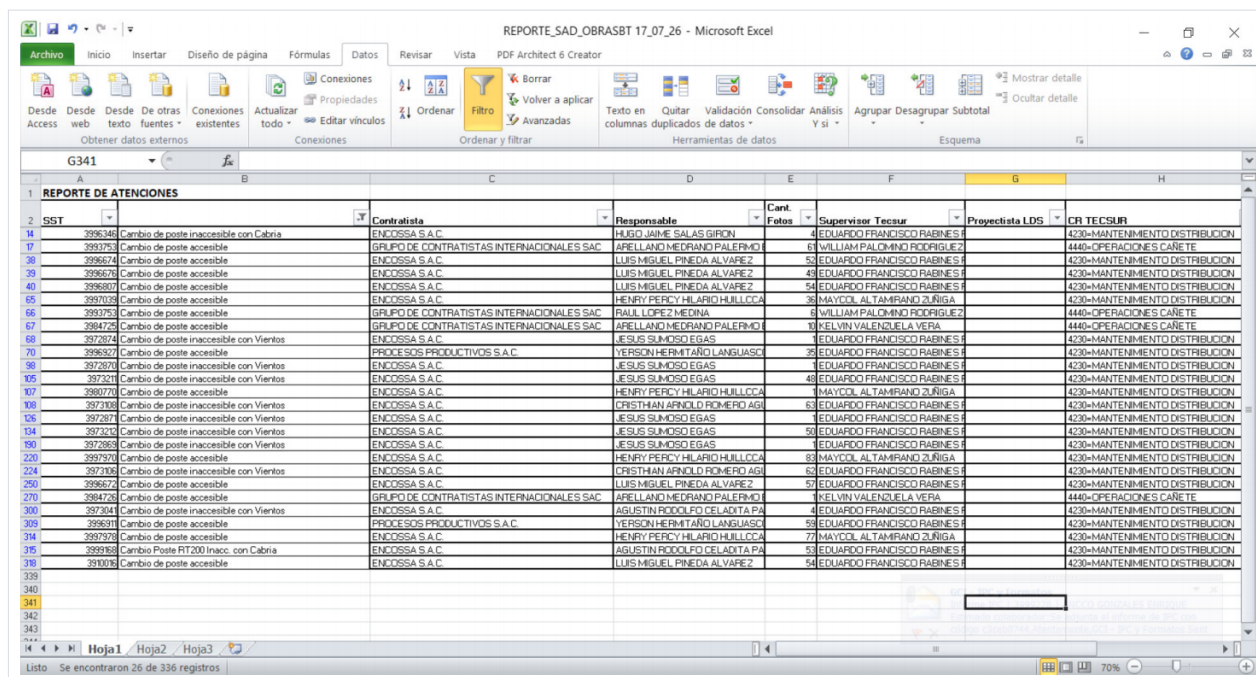

SST	Contratista	Responsable	Cant. Fotos	Supervisor Tecsur	Proyectista LDS	CR TECSUR
3996346	ENCOSA S.A.C.	HUGO JAIME SALAS GIRON	4	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3993753	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	ARELLANO MEDRANO PALERMO	6	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ	4440-OPERACIONES CANETE	
3996674	ENCOSA S.A.C.	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAPEZ	53	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3996676	ENCOSA S.A.C.	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAPEZ	49	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3996680	ENCOSA S.A.C.	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAPEZ	54	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3997039	ENCOSA S.A.C.	HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	38	MAYCOL ALTAMIRANO JUÑIGA	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3993753	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	RAUL LOPEZ MEDINA	6	WILLIAM PALOMINO RODRIGUEZ	4440-OPERACIONES CANETE	
3994725	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	ARELLANO MEDRANO PALERMO	10	KELVIN VALENZUELA VERA	4440-OPERACIONES CANETE	
3972674	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	6	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3996327	PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	YERSON HERMITARIO LANGUASCI	26	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3972670	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	6	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3973211	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	48	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3980770	ENCOSA S.A.C.	HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	1	MAYCOL ALTAMIRANO JUÑIGA	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3977039	ENCOSA S.A.C.	CHRISTIAN ARNOLD ROMERO AGUI	63	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
397267	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	6	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3973212	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	50	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3972683	ENCOSA S.A.C.	JESUS SUMOSO EGAS	1	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3997970	ENCOSA S.A.C.	HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	83	MAYCOL ALTAMIRANO JUÑIGA	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3977039	ENCOSA S.A.C.	CHRISTIAN ARNOLD ROMERO AGUI	63	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3996674	ENCOSA S.A.C.	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAPEZ	53	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3994725	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES SAC	ARELLANO MEDRANO PALERMO	10	KELVIN VALENZUELA VERA	4440-OPERACIONES CANETE	
397304	ENCOSA S.A.C.	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PA	4	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3996391	PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.	YERSON HERMITARIO LANGUASCI	59	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3997970	ENCOSA S.A.C.	HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	77	MAYCOL ALTAMIRANO JUÑIGA	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3999163	ENCOSA S.A.C.	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PA	53	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	
3910016	ENCOSA S.A.C.	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAPEZ	54	EDUARDO FRANCISCO RABINES	4230-MANTENIMIENTO DISTRIBUCION	

► Filtro por POSTE aplicado: 26 de 336 registros resultantes.

Debajo de la tabla filtrada (26 SST del Citrix), pegar en la misma columna A la lista completa de **todas las SST trabajadas durante el día** en la Base de POSTES diario.

Con ambos listados en una sola columna, se prepara la comparación de duplicados del siguiente paso.

Reporte SAD_OBRAS17 07_26 - Microsoft Excel

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaPDF Architect 6 Creator

CortarCopiarPegarCopiar formatoPortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroFormato condicionalDar formato a celdasEstilos de celdasInsertarEliminarFormatoBorrarOrdenar y filtrarBuscar y seleccionar

1350

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	REPORTE DE ATENCIONES									
2	SST	Contratista	Responsable	Cant. Faltos	Sugerencia Tecnica	Proyestista L.C.	CR TECNAR	CR LUDS	Direccion	
3	3396349	Cambio de poste inaccessible con Cable	POUSSA S.A.C.	HUGO JIMENEZ, JUAN CARLOS	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
4	3393763	Cambio de poste accesible	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES S.A.S	ARELI ANDRÉS MIRANDA PALERM	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
5	3396678	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	LUIS INGLA, PINELA ALVAREZ	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
6	3396678	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	LUIS INGLA, PINELA ALVAREZ	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
7	3396680	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	LUIS INGLA, PINELA ALVAREZ	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
8	3393763	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	2	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
9	3393763	Cambio de poste accesible	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES S.A.S	GUILLERMO LOPEZ MELOIA	3	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
10	3396742	Cambio de poste accesible	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES S.A.S	ARELI ANDRÉS MIRANDA PALERM	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
11	3396678	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
12	3396680	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	VERONICA PEREZ, ANGELA	3	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
13	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
14	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
15	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
16	3393763	Cambio de poste inaccessible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
17	3393763	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
18	3393763	Cambio de poste inaccessible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
19	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
20	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
21	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
22	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
23	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
24	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
25	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
26	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
27	3393763	Cambio de poste accesible con Viveros	GRUPO DE CONTRATISTAS INTERNACIONALES S.A.S	ARELI ANDRÉS MIRANDA PALERM	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
28	3396742	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	VERONICA PEREZ, ANGELA	3	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
29	3396680	Cambio de poste accesible con Viveros	POUSSA S.A.C.	VERONICA PEREZ, ANGELA	3	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
30	3393763	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	HENRY PERRY, ALBERTO HILL	2	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
31	3396678	Cambio de Poste FIJO con Viveros con Cable	POUSSA S.A.C.	JESUS SUAREZ FLORES	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
32	3396680	Cambio de poste accesible	POUSSA S.A.C.	LUIS INGLA, PINELA ALVAREZ	4	GUARDO FRANCISCO DABRES	4300-MANTENIMIENTO OSTRIDOCION	6010-MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29-DECEMBER-2017	
340	3396674									
341	3396674									
342	3396677									
343	3397274									
344	3396377									
345	3397270									
346	3397321									
347	3397270									
348	3397308									
349	3397271									
350	3397272									
351	3397263									
352	3397263									
353	3397308									
354	3396672									

Hoja1Hoja2Hoja3

ListaModo Filtrar

► SST del día pegadas debajo del listado filtrado del Citrix.

Con toda la columna A seleccionada (ambos listados), ir a **Inicio** → **Formato condicional** → **salto de reglas de celdas** → **Duplicar valores...**

Los SST resaltados en rojo son los que **coinciden** entre lo trabajado en el día y lo reconocido por el Citrix: ya están correctamente considerados.

Los SST **sin resaltar** son los que el Citrix reconoce como cambio de poste pero que aún no se habían agregado a la Base de POSTES diario; se deben copiar manualmente y agregarlos para completar el registro.

[illegible]

► *Formato condicional de duplicados: en rojo lo ya trabajado; sin color, lo faltante.*

47 Completar y supervisar las SST faltantes

Agregar las SST identificadas como faltantes a la Base de POSTES diario y completar su supervisión: verificar si es un cambio de poste real, un retiro (que también cuenta), o si aún no se puede determinar por falta de acceso a fotos.

Con esto se completa el conteo final del día, ya con todas las SST correctamente incorporadas.

[illegible]

► Base de POSTES diario con las SST faltantes ya agregadas y en supervisión.



05

PARTE

Armar el cuadro final



Cierre del día

PARTE 5

Armar el cuadro final


● Cierre del día

Con la Base de POSTES diario ya cerrada y verificada, se cuentan los totales del día, se actualiza el Excel maestro y se traslada la información a las hojas históricas Ejecutado y Cuadrillas y personas.

48 Contar cuadrillas, personas y postes ejecutados

De la Base de POSTES diario ya completa (incluyendo cambios y retiros, que también cuentan) se cuenta: número de **cuadrillas** distintas, número total de **personas**, y **postes ejecutados** = total de filas de la base.

Estos 3 valores se trasladan a la hoja Resumen del Excel maestro. Al ingresarlos se recalculan automáticamente el Nuevo Saldo de Postes Pendientes, Postes/Cuadrilla y la suma Semanal.

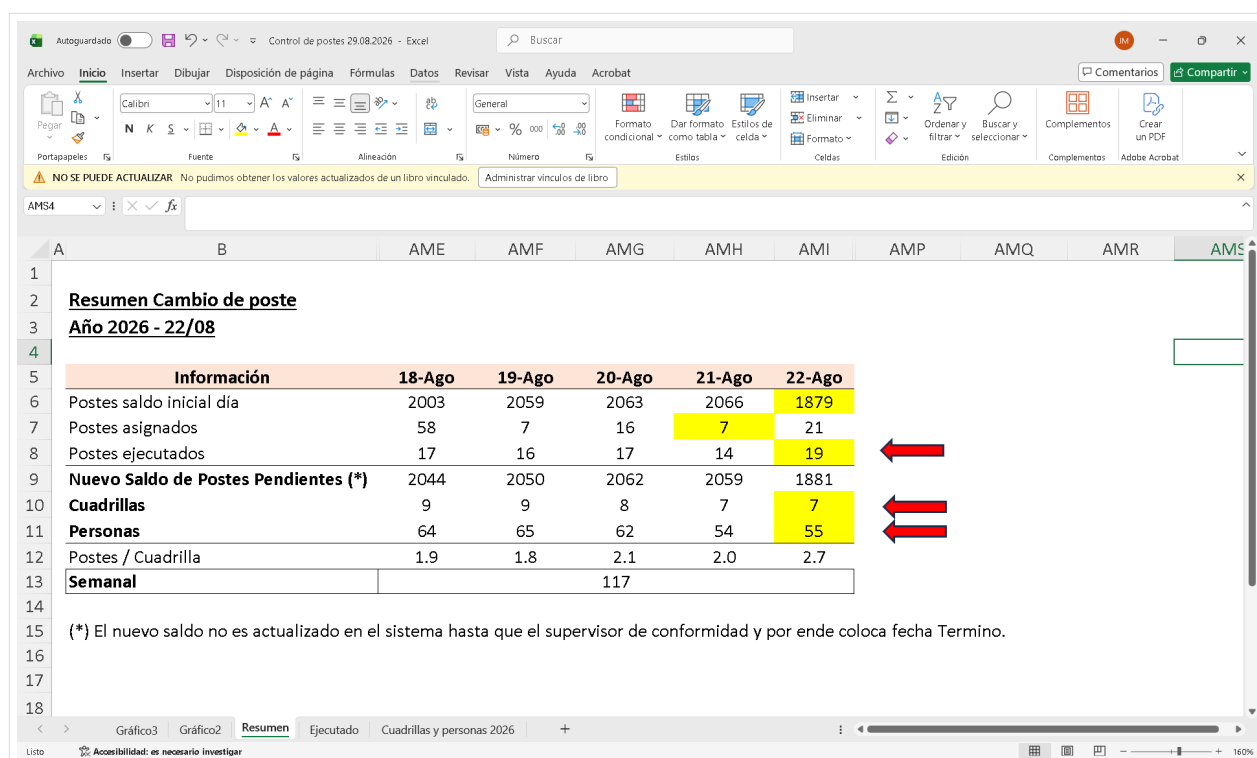


Información	18-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago
Postes saldo inicial día	2003	2059	2063	2066	1879
Postes asignados	58	7	16	7	21
Postes ejecutados	17	16	17	14	19
Nuevo Saldo de Postes Pendientes (*)	2044	2050	2062	2059	1881
Cuadrillas	9	9	8	7	7
Personas	64	65	62	54	55
Postes / Cuadrilla	1.9	1.8	2.1	2.0	2.7
Semanal	117				

(*) El nuevo saldo no es actualizado en el sistema hasta que el supervisor de conformidad y por ende coloca fecha Termino.

► Cuadro Resumen del Excel maestro ya con ejecutados, cuadrillas y personas actualizados.

49 Copiar el cuadro completo de Hoja1 a Hoja2

En la Base de POSTES diario, con el día ya completo, copiar todo el cuadro de la Hoja1 a la Hoja2, como respaldo/histórico del día cerrado.

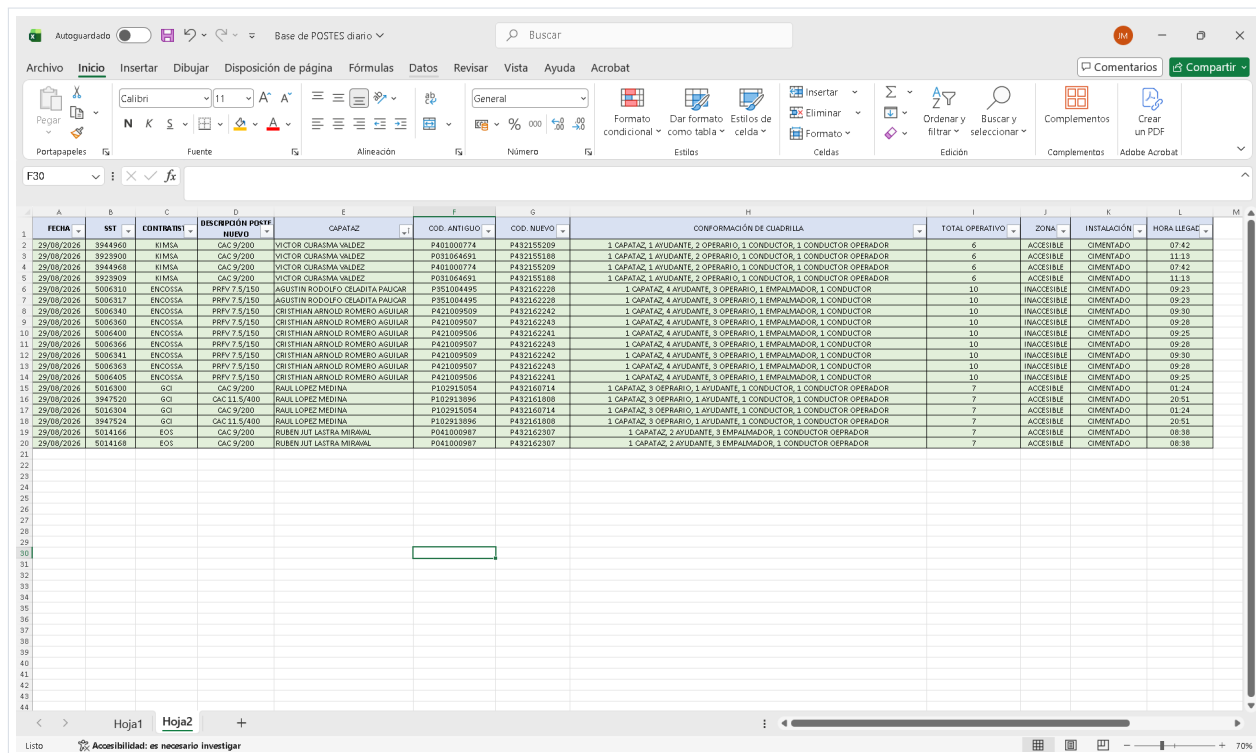


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FECHA	SST	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN POSTE	CAPATAZ	COD. ANTIGUO	COD. NUEVO	CONFORMACIÓN DE CUADRILLA	TOTAL OPERATIVO	ZONA	INSTALACIÓN	HORA LLEGADA	
29/08/2026	3944960	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P401000774	P432155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	07:42	
29/08/2026	3923900	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P031064691	P432155180	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	11:13	
29/08/2026	3944960	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P401000774	P432155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	07:42	
29/08/2026	3923900	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P031064691	P432155180	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	11:13	
29/08/2026	5006310	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351004495	P432162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:23	
29/08/2026	5006317	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351004495	P432162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:23	
29/08/2026	5006340	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:30	
29/08/2026	5006360	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28	
29/08/2026	5006400	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:25	
29/08/2026	5006366	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28	
29/08/2026	5006341	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P432162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:30	
29/08/2026	5006363	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28	
29/08/2026	5006405	ENCOSIA	PRPV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:25	
29/08/2026	5016300	GCI	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P432160714	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	01:24	
29/08/2026	3947820	GCI	CAC 11.5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913086	P432161800	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	20:51	
29/08/2026	5016304	GCI	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P432160714	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	01:24	
29/08/2026	3947824	GCI	CAC 11.5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913086	P432161800	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	20:51	
29/08/2026	5014166	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LAISTRA MIRAJAL	P041000987	P432162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	08:38	
29/08/2026	5014168	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LAISTRA MIRAJAL	P041000987	P432162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	08:38	

► Cuadro completo copiado a la Hoja2 de la Base de POSTES diario.


50 Copiar SST + Código de Poste Antiguo al Excel POSTES (Citrix)

Seleccionar el rango desde SST hasta Código Antiguo en la Base de POSTES diario (Hoja2) y pegarlo en la hoja correspondiente del Excel **POSTES** descargado del Citrix.

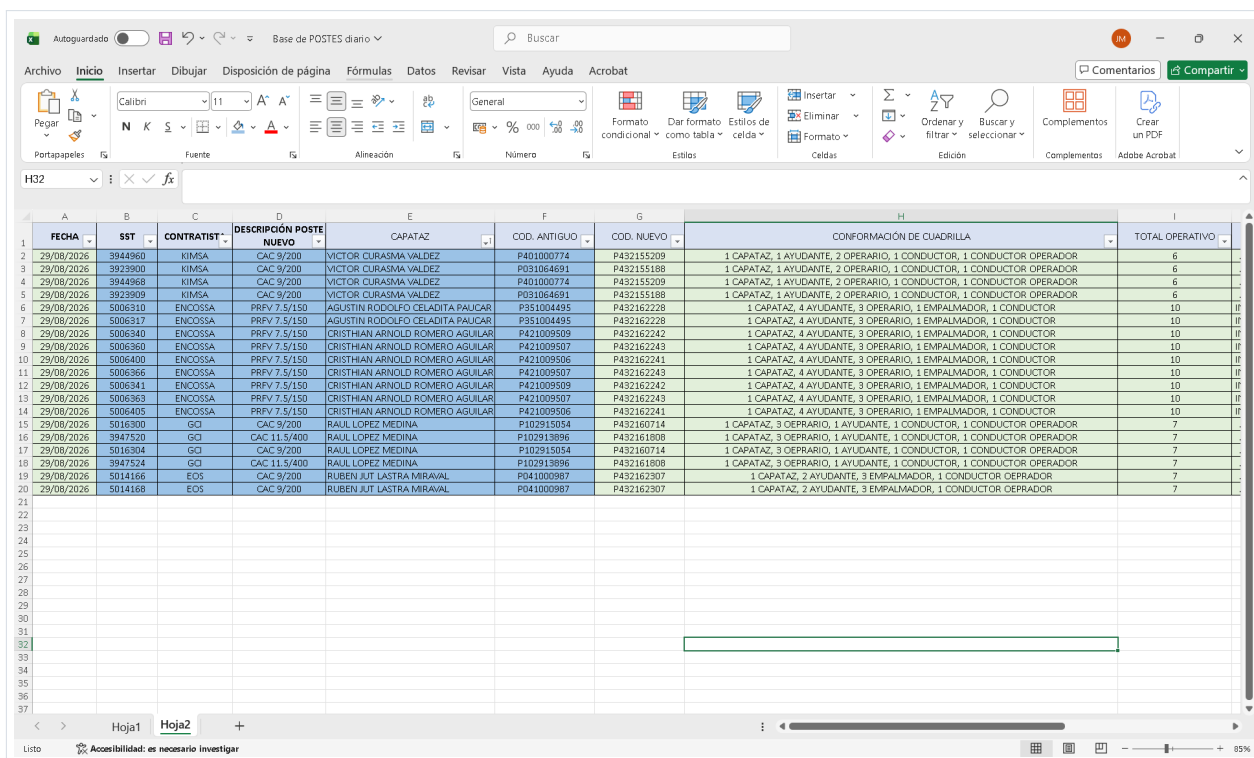

FECHA	SST	CONTRATIST	DESCRIPCIÓN POSTE	CAPATAZ	COD. ANTIGUO	COD. NUEVO	CONFORMACIÓN DE CUADRILLA	TOTAL OPERATIVO
29/08/2026	3944960	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P401000774	P432155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
29/08/2026	3923900	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P031064691	P432155188	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
29/08/2026	3944968	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P401000774	P432155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
29/08/2026	3923909	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASMA VALDEZ	P031064691	P432155188	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6
29/08/2026	5006310	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351004495	P432162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006317	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351004495	P432162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006340	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P432162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006360	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006400	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P432162241	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006366	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006341	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P432162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006363	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P432162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5006405	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P432162241	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10
29/08/2026	5016300	GO	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P432160714	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
29/08/2026	3947520	GO	CAC 11.5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913896	P432161808	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
29/08/2026	5016304	GO	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P432160714	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
29/08/2026	3947524	GO	CAC 11.5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913896	P432161808	1 CAPATAZ, 3 OEPARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7
29/08/2026	5014166	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LASTRA MIRAVAL	P041000987	P432162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OEPADOR	7
29/08/2026	5014168	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LASTRA MIRAVAL	P041000987	P432162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OEPADOR	7

► Rango SST + Código Antiguo pegado en el Excel POSTES.

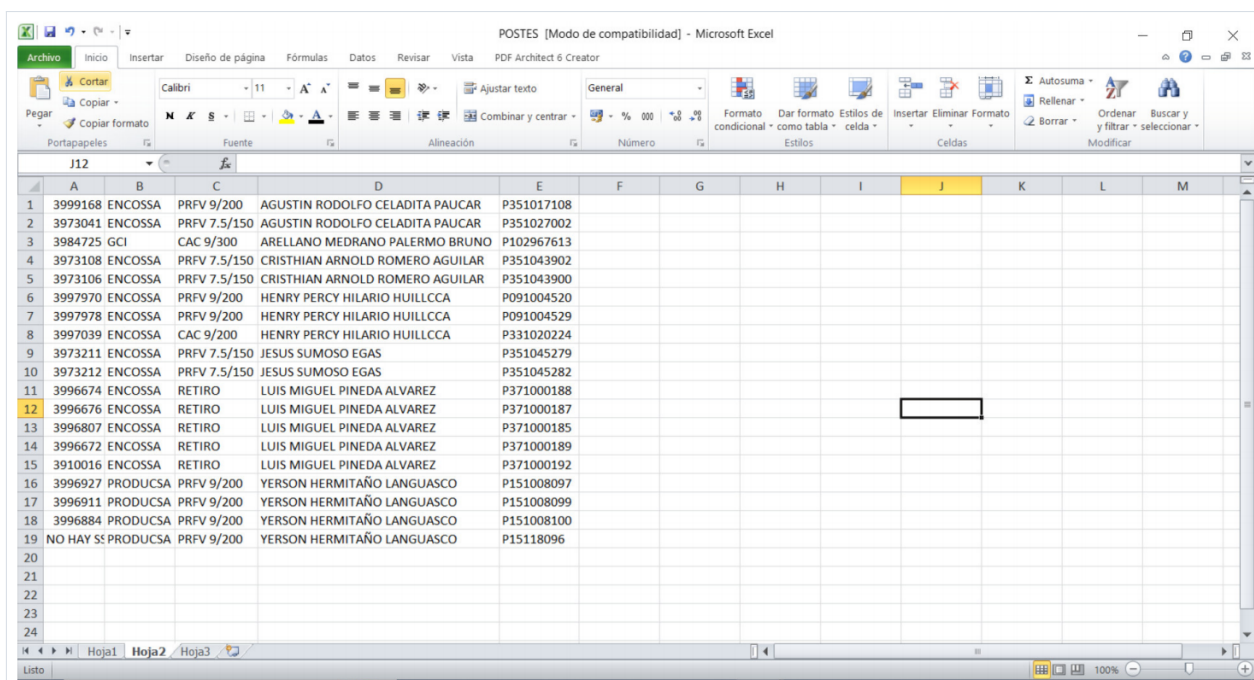

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	3999168	ENCOSSA	PRFV 9/200	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351017108							
2	3973041	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P351027002							
3	3984725	GCI	CAC 9/300	ARELLANO MEDRANO PALERMO BRUNO	P102967613							
4	3973108	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P351043902							
5	3973106	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P351043900							
6	3997970	ENCOSSA	PRFV 9/200	HENRY PERCY HILARIO HUILLCCA	P091004520							
7	3997978	ENCOSSA	PRFV 9/200	HENRY PERCY HILARIO HUILLCCA	P091004529							
8	3997039	ENCOSSA	CAC 9/200	HENRY PERCY HILARIO HUILLCCA	P331020224							
9	3973211	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	JESUS SUMOSO EGAS	P351045279							
10	3973212	ENCOSSA	PRFV 7.5/150	JESUS SUMOSO EGAS	P351045282							
11	3996674	ENCOSSA	RETIRO	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ	P371000188							
12	3996676	ENCOSSA	RETIRO	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ	P371000187							
13	3996807	ENCOSSA	RETIRO	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ	P371000185							
14	3996672	ENCOSSA	RETIRO	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ	P371000189							
15	3910016	ENCOSSA	RETIRO	LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ	P371000192							
16	3996927	PRODUCSA	PRFV 9/200	YERSON HERMITAÑO LANGUASCO	P151008097							
17	3996911	PRODUCSA	PRFV 9/200	YERSON HERMITAÑO LANGUASCO	P151008099							
18	3996884	PRODUCSA	PRFV 9/200	YERSON HERMITAÑO LANGUASCO	P151008100							
19	NO HAY S	PRODUCSA	PRFV 9/200	YERSON HERMITAÑO LANGUASCO	P15118096							


► Confirmación del cuadro pegado en la Hoja2 del Excel POSTES.

51 BUSCARV en Hoja1 del POSTES contra la Hoja2

En la Hoja1 del Excel POSTES (que contiene todas las solicitudes), agregar la fórmula:

```
=BUSCARV(A2;Hoja2!$1:$65536;1;0)
```

Si el SST está en la Hoja2 (fue trabajado hoy), devuelve el mismo número; si no, devuelve #N/A.

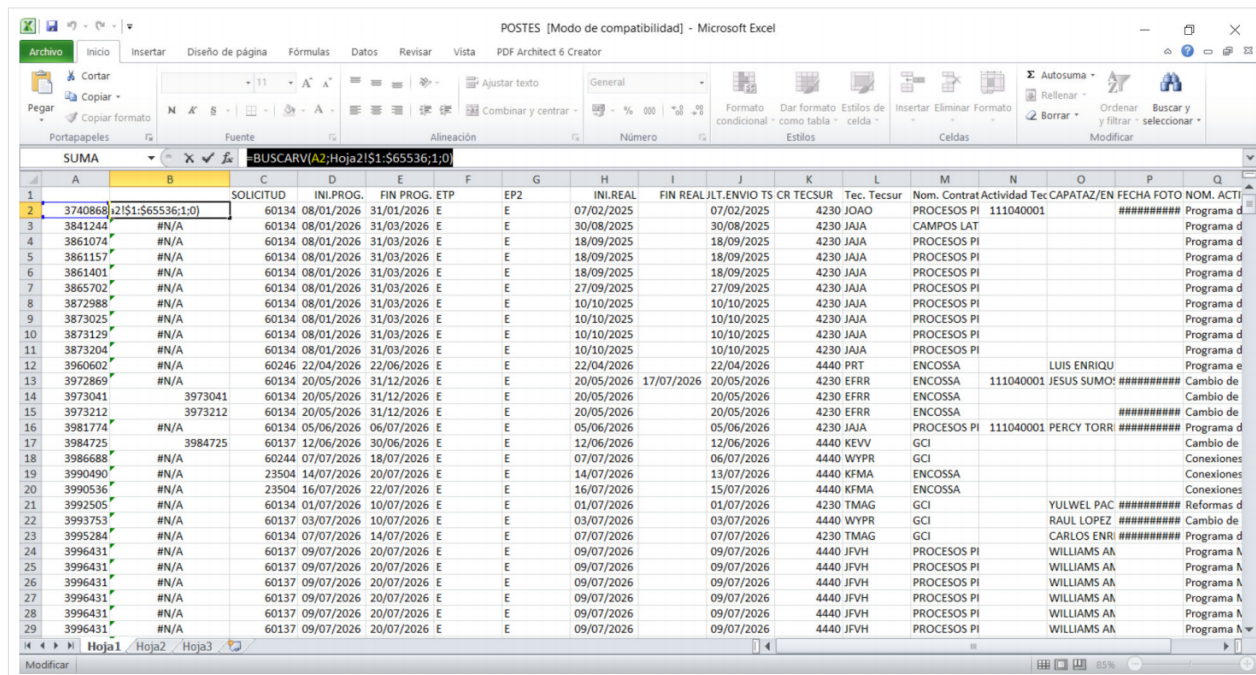

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1			SOLICITUD	INI. PROG.	FIN. PROG.	ETP	EP2	INI. REAL	FIN. REAL	ILT	ENVIO TS	CR	TCSUR	Tec. TCSUR	Nom. Contrat	Actividad Tec	CAPATAZ/EN
2	3740868	=BUSCARV(A2;Hoja2!\$1:\$65536;1;0)	60134	08/01/2026	31/01/2026	E	E	07/02/2025	07/02/2025		4230	JOAO	PROCESOS PI	111040001		FECHA FOTO	NOM. ACTI
3	3841244	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	30/08/2025	30/08/2025		4230	IAIA	CAMPOS LAT				Programa d
4	3861074	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	18/09/2025	18/09/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
5	3861157	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	18/09/2025	18/09/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
6	3861401	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	18/09/2025	18/09/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
7	3865702	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	27/09/2025	27/09/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
8	3872988	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025	10/10/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
9	3873025	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025	10/10/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
10	3873129	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025	10/10/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
11	3873204	#N/A	60134	08/01/2026	31/03/2026	E	E	10/10/2025	10/10/2025		4230	IAIA	PROCESOS PI				Programa d
12	3960602	#N/A	60246	22/04/2026	22/06/2026	E	E	22/04/2026	22/04/2026		4440	PRT	ENCOSSA		LUIS ENRIQU		Programa e
13	3972869	#N/A	60134	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSSA	111040001	JESUS SUMO	#####	Cambio de
14	3973041	3973041	60134	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSSA			#####	Cambio de
15	3973212	3973212	60134	20/05/2026	31/12/2026	E	E	20/05/2026	20/05/2026	20/05/2026	4230	EFRR	ENCOSSA			#####	Cambio de
16	3981774	#N/A	60134	05/06/2026	06/07/2026	E	E	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	4230	IAIA	PROCESOS PI	111040001	PERCY TORR	#####	Programa d
17	3984725	3984725	60137	12/06/2026	30/06/2026	E	E	12/06/2026	12/06/2026	12/06/2026	4440	KEVV	GCI				Cambio de
18	3986688	#N/A	60244	07/07/2026	18/07/2026	E	E	07/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	4440	WYPR	GCI				Conexiones
19	3990490	#N/A	23504	14/07/2026	20/07/2026	E	E	14/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	4440	KFMA	ENCOSSA				Conexiones
20	3990536	#N/A	23504	16/07/2026	22/07/2026	E	E	16/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	4440	KFMA	ENCOSSA				Conexiones
21	3992505	#N/A	60134	01/07/2026	10/07/2026	E	E	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	4230	TMAG	GCI		YULWEL PAC	#####	Reformas d
22	3993753	#N/A	60137	03/07/2026	10/07/2026	E	E	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	4440	WYPR	GCI		RAUL LOPEZ	#####	Cambio de
23	3995284	#N/A	60134	07/07/2026	14/07/2026	E	E	07/07/2026	07/07/2026	07/07/2026	4230	TMAG	GCI		CARLOS ENRI	#####	Programa d
24	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h
25	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h
26	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h
27	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h
28	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h
29	3996431	#N/A	60137	09/07/2026	20/07/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	09/07/2026	4440	JFVH	PROCESOS PI		WILLIAMS AN		Programa h

► BUSCARV identificando qué SST corresponden al trabajo de hoy.

53 Pegar toda la información en la hoja «Ejecutado»

Copiar toda la información consolidada del Excel POSTES y pegarla en el Excel maestro, hoja **Ejecutado**, agregando las filas nuevas del día al final del histórico existente.

Nom. Contratista	Actividad Tecsur	CAPATAZENCARGADO	FECHA FOTO FIN OBRA	NOM. ACTIVIDAD OPERA	MACROACTIVIDAD OPERA	COD. POSTE
PROCESOS PRODUCTIVOS S.A.C.						
KIMSA		VICTOR CURASMA VALDEZ	14/07/2025 14:47	Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P1002378
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P3000363
ENCOSA		HENRY PERCY HILARIO HULLCCA		Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P30045242
ENCOSA		ROBERT ALEX VILLEGAS VERA		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P40005247
ENCOSA		ROBERT ALEX VILLEGAS VERA	14/07/2025 13:43	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P09003954
ENCOSA		RUBEN JUT LASTRA MIRAVALL		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10000055
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS	14/07/2025 15:21	Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P30045251
GC		ARELLANO MEDRANO PALERMO BRUNO	14/07/2025 13:33	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10290068
ENCOSA		LUIS MIGUEL PINEDA ALVAREZ		Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P30006006
ENCOSA		RUBEN JUT LASTRA MIRAVALL		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10008072
ENCOSA		HENRY PERCY HILARIO HULLCCA		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P40005251
ENCOSA		ARELLANO MEDRANO PALERMO BRUNO		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10291401
ENCOSA		AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	14/07/2025 15:20	Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P29009004
ENCOSA		HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	14/07/2025 12:47	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P40005234
ENCOSA		ROBERT ALEX VILLEGAS VERA	14/07/2025 11:06	Cambio de Poste prioritario Accesible	Cambio postes accesible	P09004889
ENCOSA		RUBEN JUT LASTRA MIRAVALL		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10008057
ENCOSA		CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR		Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P10000636
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS		Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P10005530
GC		ARELLANO MEDRANO PALERMO BRUNO	15/07/2025 17:03	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10391021
ENCOSA		HENRY PERCY HILARIO HULLCCA	15/07/2025 16:14	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P40001079
ENCOSA		VICTOR CURASMA VALDEZ	15/07/2025 16:12	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10003928
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS		Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P10005531
ENCOSA		HENRY PERCY HILARIO HULLCCA		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P40000863
ENCOSA		RUBEN JUT LASTRA MIRAVALL		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10005481
ENCOSA		CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR		Cambio de poste inaccesible con Vientos	Mantenimiento postes inaccesible	P10003967
ENCOSA		RUBEN JUT LASTRA MIRAVALL		Cambio de Poste RT 200 Accesible	Cambio postes accesible	P10008669
ENCOSA		ROBERT ALEX VILLEGAS VERA		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10005536
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS	15/07/2025 14:04	Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P29002794
ENCOSA		AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	15/07/2025 14:16	Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P30020282
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS		Cambio de poste inaccesible con Cabria	Mantenimiento postes inaccesible	P10005527
ENCOSA		ROBERT ALEX VILLEGAS VERA		Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10000630
ENCOSA		JESUS SUMOSO EGAS	15/07/2025 15:09	Cambio de poste accesible	Cambio postes accesible	P10005528

► Hoja Ejecutado del Excel maestro antes del pegado.

SOLICITU	CRUDE	Ejecutados	DIS. OBRA	INI. PROG.	FIN. PROG.	ETP.	EP2	INI. REA.	FIN. REA.	ULT. ENVIO	CR. TCSU	DEPARTAMENTO	Tec. Tecsur
1879	3972863	60134	Postes Ejecutados	3-ATE-VITARTE	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1880	3996306	60134	Postes Ejecutados	29-SAN JUAN DE MIRAFLORES	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1881	3531811	60134	Postes Ejecutados	35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2003/2026	31/03/2026	E	E	2003/2026	2003/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1882	3972870	60134	Postes Ejecutados	3-ATE-VITARTE	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1883	3996302	60134	Postes Ejecutados	19-ALLA VICTORIA	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	MA2
1884	3972871	60134	Postes Ejecutados	3-ATE-VITARTE	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1885	3996303	60134	Postes Ejecutados	42-VILLA EL SALVADOR	07/07/2026	22/07/2026	E	E	07/07/2026	07/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	MA2
1886	3996485	60134	Postes Ejecutados	35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	EFFR
1887	3997006	60134	Postes Ejecutados	19-PACHACAMAC	10/07/2026	20/07/2026	E	E	10/07/2026	10/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	MA2
1888	3996125	60134	Postes Ejecutados	15-LURIGANCHO-CHOSICA	10/07/2026	20/07/2026	E	E	10/07/2026	10/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	FCM
1889	3996864	60134	Postes Ejecutados	19-ALLA VICTORIA	14/07/2026	14/07/2026	E	E	14/07/2026	14/07/2026	4230	Mantenimiento de Redes	MA2
1890	3972041	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	310/7811		EFFR
1891	3972042	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	310/7811		EFFR
1892	3984725	60137		102-SAN VICENTE DE CAÑETE	13/06/2026	30/06/2026	E	E	13/06/2026	13/06/2026	260/2192		KEVV
1893	3996807	60134		37-SANTA MARIA	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	310/7811		EFFR
1894	3973700	60134		9-CHORRILLOS	19/07/2026	31/07/2026	E	E	19/07/2026	19/07/2026	310/7811		MA2
1895	3910016	60134		37-SANTA MARIA	07/07/2026	30/07/2026	E	E	07/07/2026	07/07/2026	310/7811		EFFR
1896	3973706	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	310/7811		EFFR
1897	3996672	60134		37-SANTA MARIA	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	310/7811		EFFR
1898	3996911	60134		15-LURIGANCHO-CHOSICA	10/07/2026	20/07/2026	E	E	10/07/2026	10/07/2026	310/7811		EFFR
1899	3997878	60134		9-CHORRILLOS	19/07/2026	31/07/2026	E	E	19/07/2026	19/07/2026	310/7811		MA2
1900	3973709	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	310/7811		EFFR
1901	3996674	60134		37-SANTA MARIA	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	310/7811		EFFR
1902	3996827	60134		15-LURIGANCHO-CHOSICA	10/07/2026	20/07/2026	E	E	10/07/2026	10/07/2026	310/7811		EFFR
1903	3973211	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2009/2026	31/03/2026	E	E	2009/2026	2009/2026	310/7811		EFFR
1904	3996676	60134		37-SANTA MARIA	09/07/2026	10/09/2026	E	E	09/07/2026	09/07/2026	310/7811		EFFR
1905	3997038	60134		33-SANTIAGO DE SURCO	10/07/2026	15/07/2026	E	E	10/07/2026	10/07/2026	310/7811		MA2
1906	3999169	60134		35-VILLA MARIA DEL TRIUNFO	19/07/2026	22/07/2026	E	E	19/07/2026	19/07/2026	310/7811		EFFR

► Filas nuevas del día agregadas al histórico de la hoja Ejecutado.


54 Continuar con «Cuadrillas y Personas 2026»

Pasar a la hoja **Cuadrillas y Personas 2026** del Excel maestro, ubicada justo al lado de la hoja Ejecutado.

55 Copiar el cuadro de la Base de POSTES diario a Cuadrillas y Personas 2026

Copiar el cuadro completo de la Base de POSTES diario (Fecha, SST, Contratista, Descripción, Capataz, Códigos, Conformación de Cuadrilla, Total Operativos, Zona, Instalación, Hora de Llegada) y pegarlo en esta hoja.

Con esto se alimenta el histórico de cuadrillas y personas por cada poste trabajado.

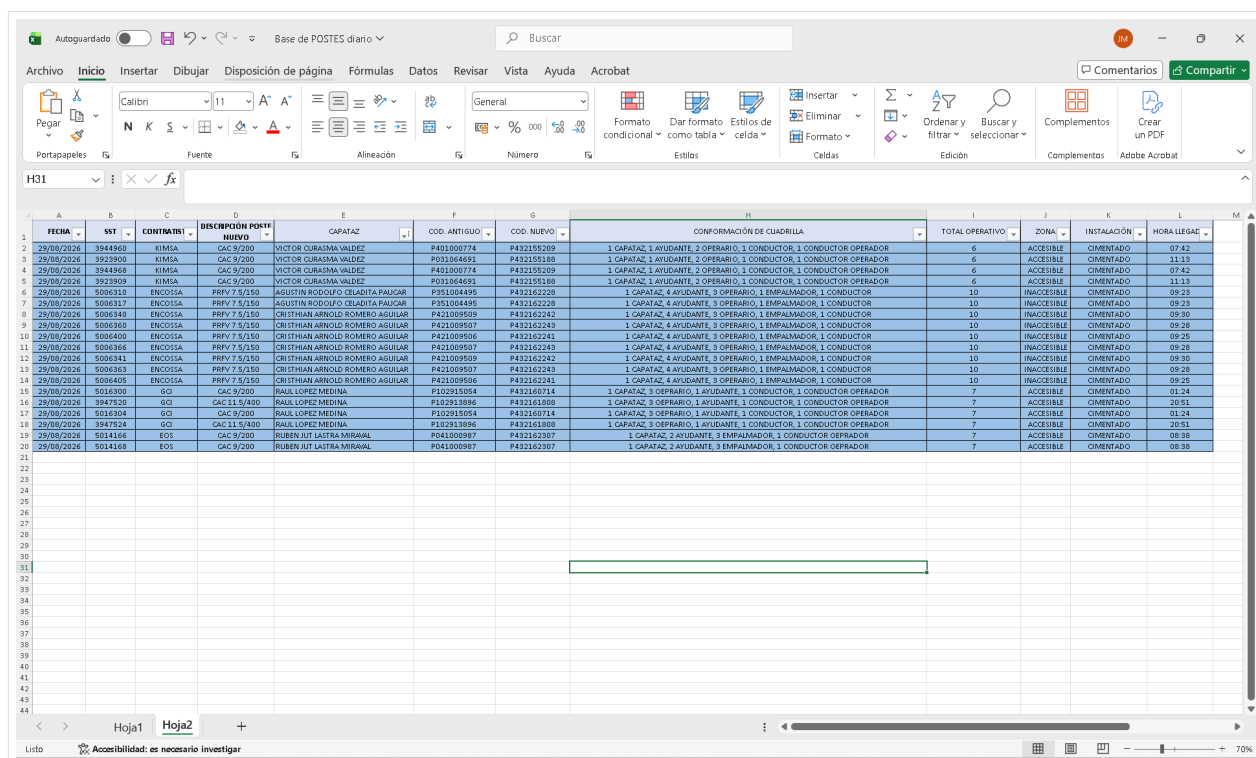

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
FECHA	SST	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN POSTE	CAPATAZ	COD. ANTIGUO	COD. NUEVO	CONFORMACIÓN DE CUADRILLA	TOTAL OPERATIVO	ZONA	INSTALACIÓN	HORA LLEGADA
29/08/2026	3944960	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASIMA VALDEZ	P491000774	P492155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	07:42
29/08/2026	3923900	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASIMA VALDEZ	P031064691	P492155188	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	11:13
29/08/2026	3944960	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASIMA VALDEZ	P491000774	P492155209	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	07:42
29/08/2026	3923900	KIMSA	CAC 9/200	VICTOR CURASIMA VALDEZ	P031064691	P492155188	1 CAPATAZ, 1 AYUDANTE, 2 OPERARIO, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	6	ACCESIBLE	CIMENTADO	11:13
29/08/2026	5006310	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P391004495	P492162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:23
29/08/2026	5006317	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	AGUSTIN RODOLFO CELADITA PAUCAR	P391004495	P492162228	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:23
29/08/2026	5006340	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P492162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:30
29/08/2026	5006360	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P492162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28
29/08/2026	5006400	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P492162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28
29/08/2026	5006366	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P492162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28
29/08/2026	5006341	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009509	P492162242	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:30
29/08/2026	5006363	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009507	P492162243	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:28
29/08/2026	5006400	ENCOSISA	PRPV 7 5/150	CRISTHIAN ARNOLD ROMERO AGUILAR	P421009506	P492162241	1 CAPATAZ, 4 AYUDANTE, 3 OPERARIO, 1 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR	10	INACCESIBLE	CIMENTADO	09:25
29/08/2026	5016300	GCI	CAC 9/200	RAUL LOPEZ MEDINA	P102915054	P492160714	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	01:24
29/08/2026	3947520	GCI	CAC 11 5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913896	P492161808	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	20:51
29/08/2026	3947524	GCI	CAC 11 5/400	RAUL LOPEZ MEDINA	P102913896	P492161808	1 CAPATAZ, 3 OPERARIO, 1 AYUDANTE, 1 CONDUCTOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	20:51
29/08/2026	5014166	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LAITRA MIRABAL	P041000987	P492162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	08:38
29/08/2026	5014168	EOS	CAC 9/200	RUBEN JUT LAITRA MIRABAL	P041000987	P492162307	1 CAPATAZ, 2 AYUDANTE, 3 EMPALMADOR, 1 CONDUCTOR OPERADOR	7	ACCESIBLE	CIMENTADO	08:38

► Base de POSTES diario lista para copiar hacia Cuadrillas y Personas 2026.

► *Filas del día agregadas al histórico de Cuadrillas y Personas 2026.*

✓ LISTO

Excel maestro completo. Con el llenado de Resumen, Gráfico2, Gráfico3, Ejecutado y Cuadrillas y Personas 2026, el Excel maestro del día queda finalizado y listo para el envío.



06

PARTE

Envío del cuadro por correo



Fin del día

PARTE 6


Envío del cuadro por correo

- Fin del día

56 Ubicar el correo del día anterior

En Outlook, buscar en la bandeja de entrada el correo enviado ayer con el asunto «Actividades relacionadas a cambio de poste» (remitente de referencia habitual, con el Excel maestro adjunto). Ahora seleccionamos cualquiera para apartir de aqui hacer el reenvío.

Hacer clic en **Responder a todos**, lo que mantiene automáticamente a todos los destinatarios y copias habituales.

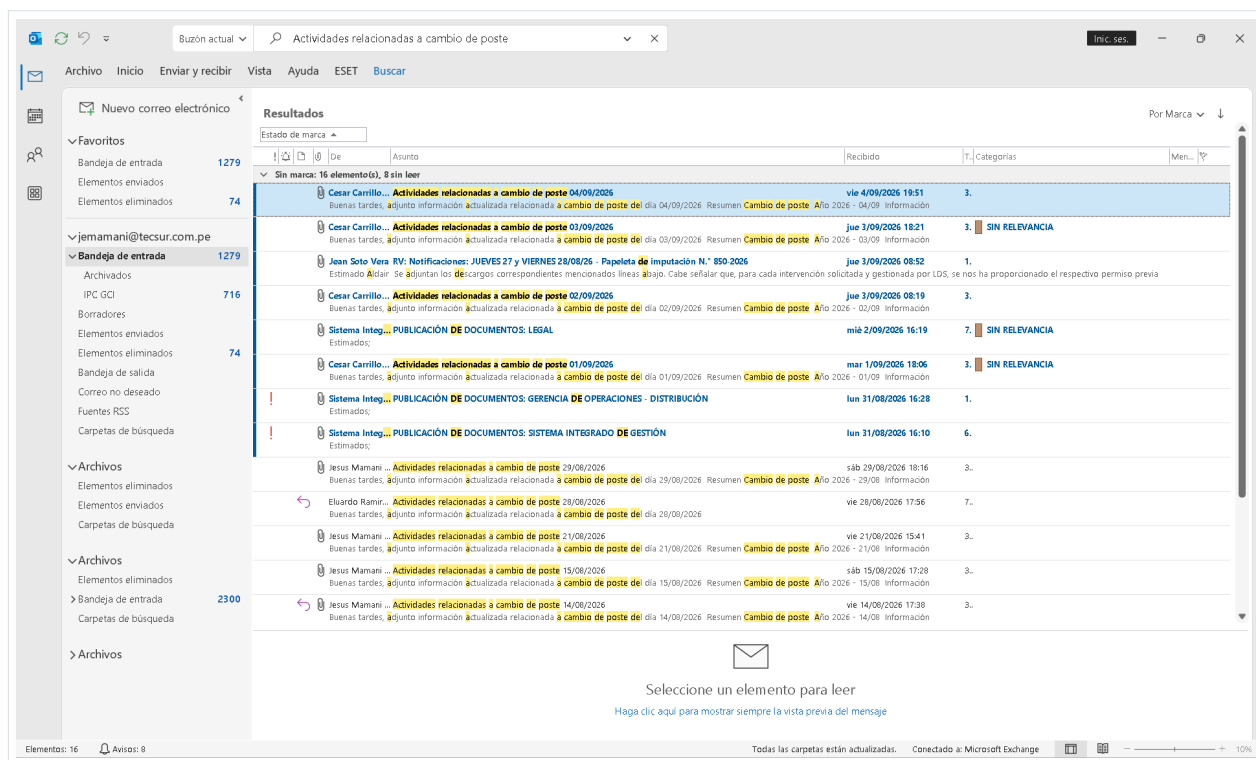

The screenshot shows the Outlook interface with a search for "Actividades relacionadas a cambio de poste". The search results are displayed in a table with columns for "De" (From), "Asunto" (Subject), "Recibido" (Received), and "Categorías" (Categories). The results list several emails from various senders, including Cesar Carrillo, Juan Soto Vera, and Jesus Mamani, all with subjects related to "Actividades relacionadas a cambio de poste". The interface also shows the left sidebar with folders like "Bandeja de entrada" and "Archivos".

De	Asunto	Recibido	Categorías
Cesar Carrillo...	Actividades relacionadas a cambio de poste 04/09/2026	vie 4/09/2026 19:51	3.
Cesar Carrillo...	Actividades relacionadas a cambio de poste 03/09/2026	jue 3/09/2026 18:21	3. SIN RELEVANCIA
Juan Soto Vera RV	Notificación: JUEVES 27 y VIERNES 28/08/26 - Papeleta de Imputación N.º 850-2026	jue 3/09/2026 08:52	1.
Cesar Carrillo...	Actividades relacionadas a cambio de poste 02/09/2026	jue 3/09/2026 08:19	3.
Sistema Integ...	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS: LEGAL	mié 2/09/2026 16:19	7. SIN RELEVANCIA
Cesar Carrillo...	Actividades relacionadas a cambio de poste 01/09/2026	mar 1/09/2026 18:06	3. SIN RELEVANCIA
Sistema Integ...	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS: GERENCIA DE OPERACIONES - DISTRIBUCIÓN	lun 31/08/2026 16:28	1.
Sistema Integ...	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	lun 31/08/2026 16:10	6.
Jesus Mamani...	Actividades relacionadas a cambio de poste 29/08/2026	sáb 29/08/2026 18:16	3.
Eduardo Ramir...	Actividades relacionadas a cambio de poste 28/08/2026	vie 28/08/2026 17:56	7.
Jesus Mamani...	Actividades relacionadas a cambio de poste 21/08/2026	vie 21/08/2026 15:41	3.
Jesus Mamani...	Actividades relacionadas a cambio de poste 15/08/2026	sáb 15/08/2026 17:28	3.
Jesus Mamani...	Actividades relacionadas a cambio de poste 14/08/2026	vie 14/08/2026 17:38	3.

► Búsqueda de «Actividades relacionadas a cambio de poste» en Outlook.

Actividades relacionadas a cambio de poste 04/09/2026 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda ESET ¿Qué desea hacer?

Eliminar Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Todas las aplicaciones IPC GCI Marcar como no leído Buscar Zoom

Actividades relacionadas a cambio de poste 04/09/2026

Cesar Carrillo Laureano
Para: Rogger García Anaya; Freddy Crispin Calderon; José Antonio Suazo Bellacci; Jorge Kanemoto Ramos; Manuel Arroyo Chavez; Jose Ibarcena Concha
CC: José Antonio Suazo Bellacci; Jorge Kanemoto Ramos; Manuel Arroyo Chavez; Jhonny Reina Castro; Giancarlo Goñez Simic; Pierina Mera Rodriguez; Steven Melgarejo Diaz; Jessica Uodla Tuanama; Oswaldo Ramos Vicharra;
Centro de Supervision; Karen Ccasani Flores; Rosmel Quispe Diaz; Rosmel Quispe Diaz

Control de postes 04.09.26.xlsx
3 MB

Buenas tardes, adjunto información actualizada relacionada a cambio de poste del día 04/09/2026

Resumen Cambio de poste
Año 2026 - 04/09

Información	31-Ago	1-Set	2-Set	3-Set	4-Set
Postes saldo inicial día	1858	1889	1872	1854	1857
Postes asignados	54	8	13	7	0
Postes ejecutados	18	16	16	11	19
Nuevo Saldo de Postes Pendientes (*)	1894	1881	1869	1850	1838
Cuadrillas	9	7	9	6	9
Personas	63	53	68	46	69
Postes / Cuadrilla	2.0	2.3	1.8	1.8	2.1
Semanal			80		

(*) El nuevo saldo no es actualizado en el sistema hasta que el supervisor de conformidad y por ende coloca fecha Termino.

Atte.

 **Cesar Fernando Carrillo Laureano**
Control de obras
Tecsur S.A.
Pasaje Calango #158, San Juan de Miraflores
Lima 29, Perú
C. (51) 934 334 505

► Búsqueda del correo anterior en Outlook y botón Responder a todos.

56 Actualizar el mensaje, el cuadro y el adjunto

Actualizar el **Asunto** a la fecha de hoy. En el cuerpo, eliminar el cuadro Resumen del día anterior y pegar el cuadro actualizado (con todas las columnas históricas visibles: saldo inicial, asignados, ejecutados, nuevo saldo, cuadrillas, personas, postes/cuadrilla, semanal).

Actualizar el archivo **adjunto** al Excel maestro del día (Control de postes DD.MM.26.xlsx).

Clic en Enviar. Verificar en la carpeta Elementos enviados que el correo salga con el asunto correcto, los destinatarios completos y el adjunto correspondiente.

Actividades relacionadas a cambio de poste 22/08/2026 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Insertar Opciones Formato de texto Revisar Ayuda Diseño de tabla Disposición de tabla ¿Qué desea hacer?

Times New Roman 10 N K S A

Enviar Para Cesar Carrillo Laureano; Rogger Garcia Anaya; Freddy Crispin Calderon; José Antonio Suazo Bellacci; Jorge Kanemoto Ramos; Manuel Arroyo Chavez; Jose Ibarcena Concha

CC José Antonio Suazo Bellacci; Jorge Kanemoto Ramos; Manuel Arroyo Chavez; Johnny Beina Castro; Giancarlo Gofez Simic; Pierina Mera Rodriguez; Steven Melgarejo Diaz; Jessica Uoclla Tuanama; Oswaldo Ramos Vicharra; El Centro de Supervision; Karen Casani Flores; Rosmel Quispe Diaz; Rosmel Quispe Diaz

Asunto Actividades relacionadas a cambio de poste 22/08/2026

Buenas tardes, adjunto información actualizada relacionada a cambio de poste del día 22/08/2026

Resumen Cambio de poste Año 2026 - 22/08

Información	18-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago
Postes saldo inicial día	2003	2059	2063	2066	1879
Postes asignados	58	7	16	7	21
Postes ejecutados	17	16	17	14	19
Nuevo Saldo de Postes Pendientes (*)	2044	2050	2062	2059	1881
Cuadrillas	9	9	8	7	7
Personas	64	65	62	54	55
Postes / Cuadrilla	1.9	1.8	2.1	2.0	2.7
Semanal			117		

(*) El nuevo saldo no es actualizado en el sistema hasta que el supervisor de conformidad y por ende coloca fecha Término.

Atte.



Jesús Eduardo Mamani Cervantes
Control de Obras
Tecsur S.A.
Pasaje Colango # 158, San Juan de Miraflores
Lima 29, Perú
C. (51) 924901626

Aviso de Confidencialidad

*Esta comunicación y cualquier documento anexo es información privilegiada y confidencial y está dirigida exclusivamente a sus destinatarios. Cualquier revisión, difusión o copia no autorizada está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique de inmediato al remitente por e-mail y

► Mensaje actualizado con el cuadro Resumen del día y el adjunto correspondiente.

✓ LISTO

Con este envío se cierra la jornada. El Excel maestro enviado hoy será el que se descargue mañana por la mañana para volver a empezar el ciclo desde la Parte 1.
